

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento regionale Tecnico

Servizio 5
Espletamento di Servizi di Ingegneria di competenza Regionale
e/o per conto di Enti Locali
(per le provincie di Palermo, Caltanissetta, Agrigento, Trapani)

Comune di Polizzi Generosa
Intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile di interesse storico artistico-monumentale
"Masseria Verbumcaudo"
PROGETTO ESECUTIVO

CUP: G39D22000010001 CIG:




Elaborati	DOCUMENTI CONTRATTUALI	Scala Disegno
DC.01	Elaborati grafici di progetto	
	Cronoprogramma	Rev. 00
Data Emissione	12/04/2023	

Visti e pareri	Tavola 74
----------------	--------------

PROGETTISTI arch. Gaetano Colletti arch. Gabriella Catarinicchia arch. Vittorio Primo Falletta	CALCOLI STRUTTURALI arch. Gaetano Colletti Coordinatore per la sicurezza arch. Vittorio Primo Falletta	IL R.U.P. ing. Giuseppe Pirrello
---	---	-------------------------------------

LAVORAZIONE	IMPORTO	DATA	IMPORTO PROGRESSIVO
SICUREZZA LAVORI EDILI (Inizio Lavori 04/09/2023)	56.377,34	04/09/2023	56.377,34
LAVORI STRADALI TRONCO A 02/10/2023	230.690,02	02/10/2023	287.067,36
OPERE EDILI IN COPERTURA 30/10/23	311.059,99	30/10/2023	598.127,35
LAVORI STRADALI TRONCO B 20/11/23	65.461,34	20/11/2023	663.588,69
TRONCO B Prog 0+300 21/11/23	60.634,01	21/11/2023	724.222,70
SISTEMI ANTICADUTA 04/12/2023	57.878,81	04/12/2023	782.101,51
RESTAURO E DI RISANAMENTO 04/12/2023	120.832,00	02/01/2024	902.933,51
TRONCO B Prog 1+100 02/01/2024	172.922,80	02/01/2024	1.075.856,31
OPERE EDILI INTERNE 15/01/2024	934.167,93	15/01/2024	2.010.024,24
IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI 03/09/2024	561.601,70	03/09/2024	2.571.625,94
LAVORI STRUTTURALI 25/09/2024	487.307,84	25/09/2024	3.058.933,78
TRONCO B Prog 1+300 F 12/02/2024	77.338,64	12/02/2024	3.136.272,42
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 25/03/2025	465.308,96	25/03/2025	3.601.581,38
FINE LAVORI 24/06/2025			

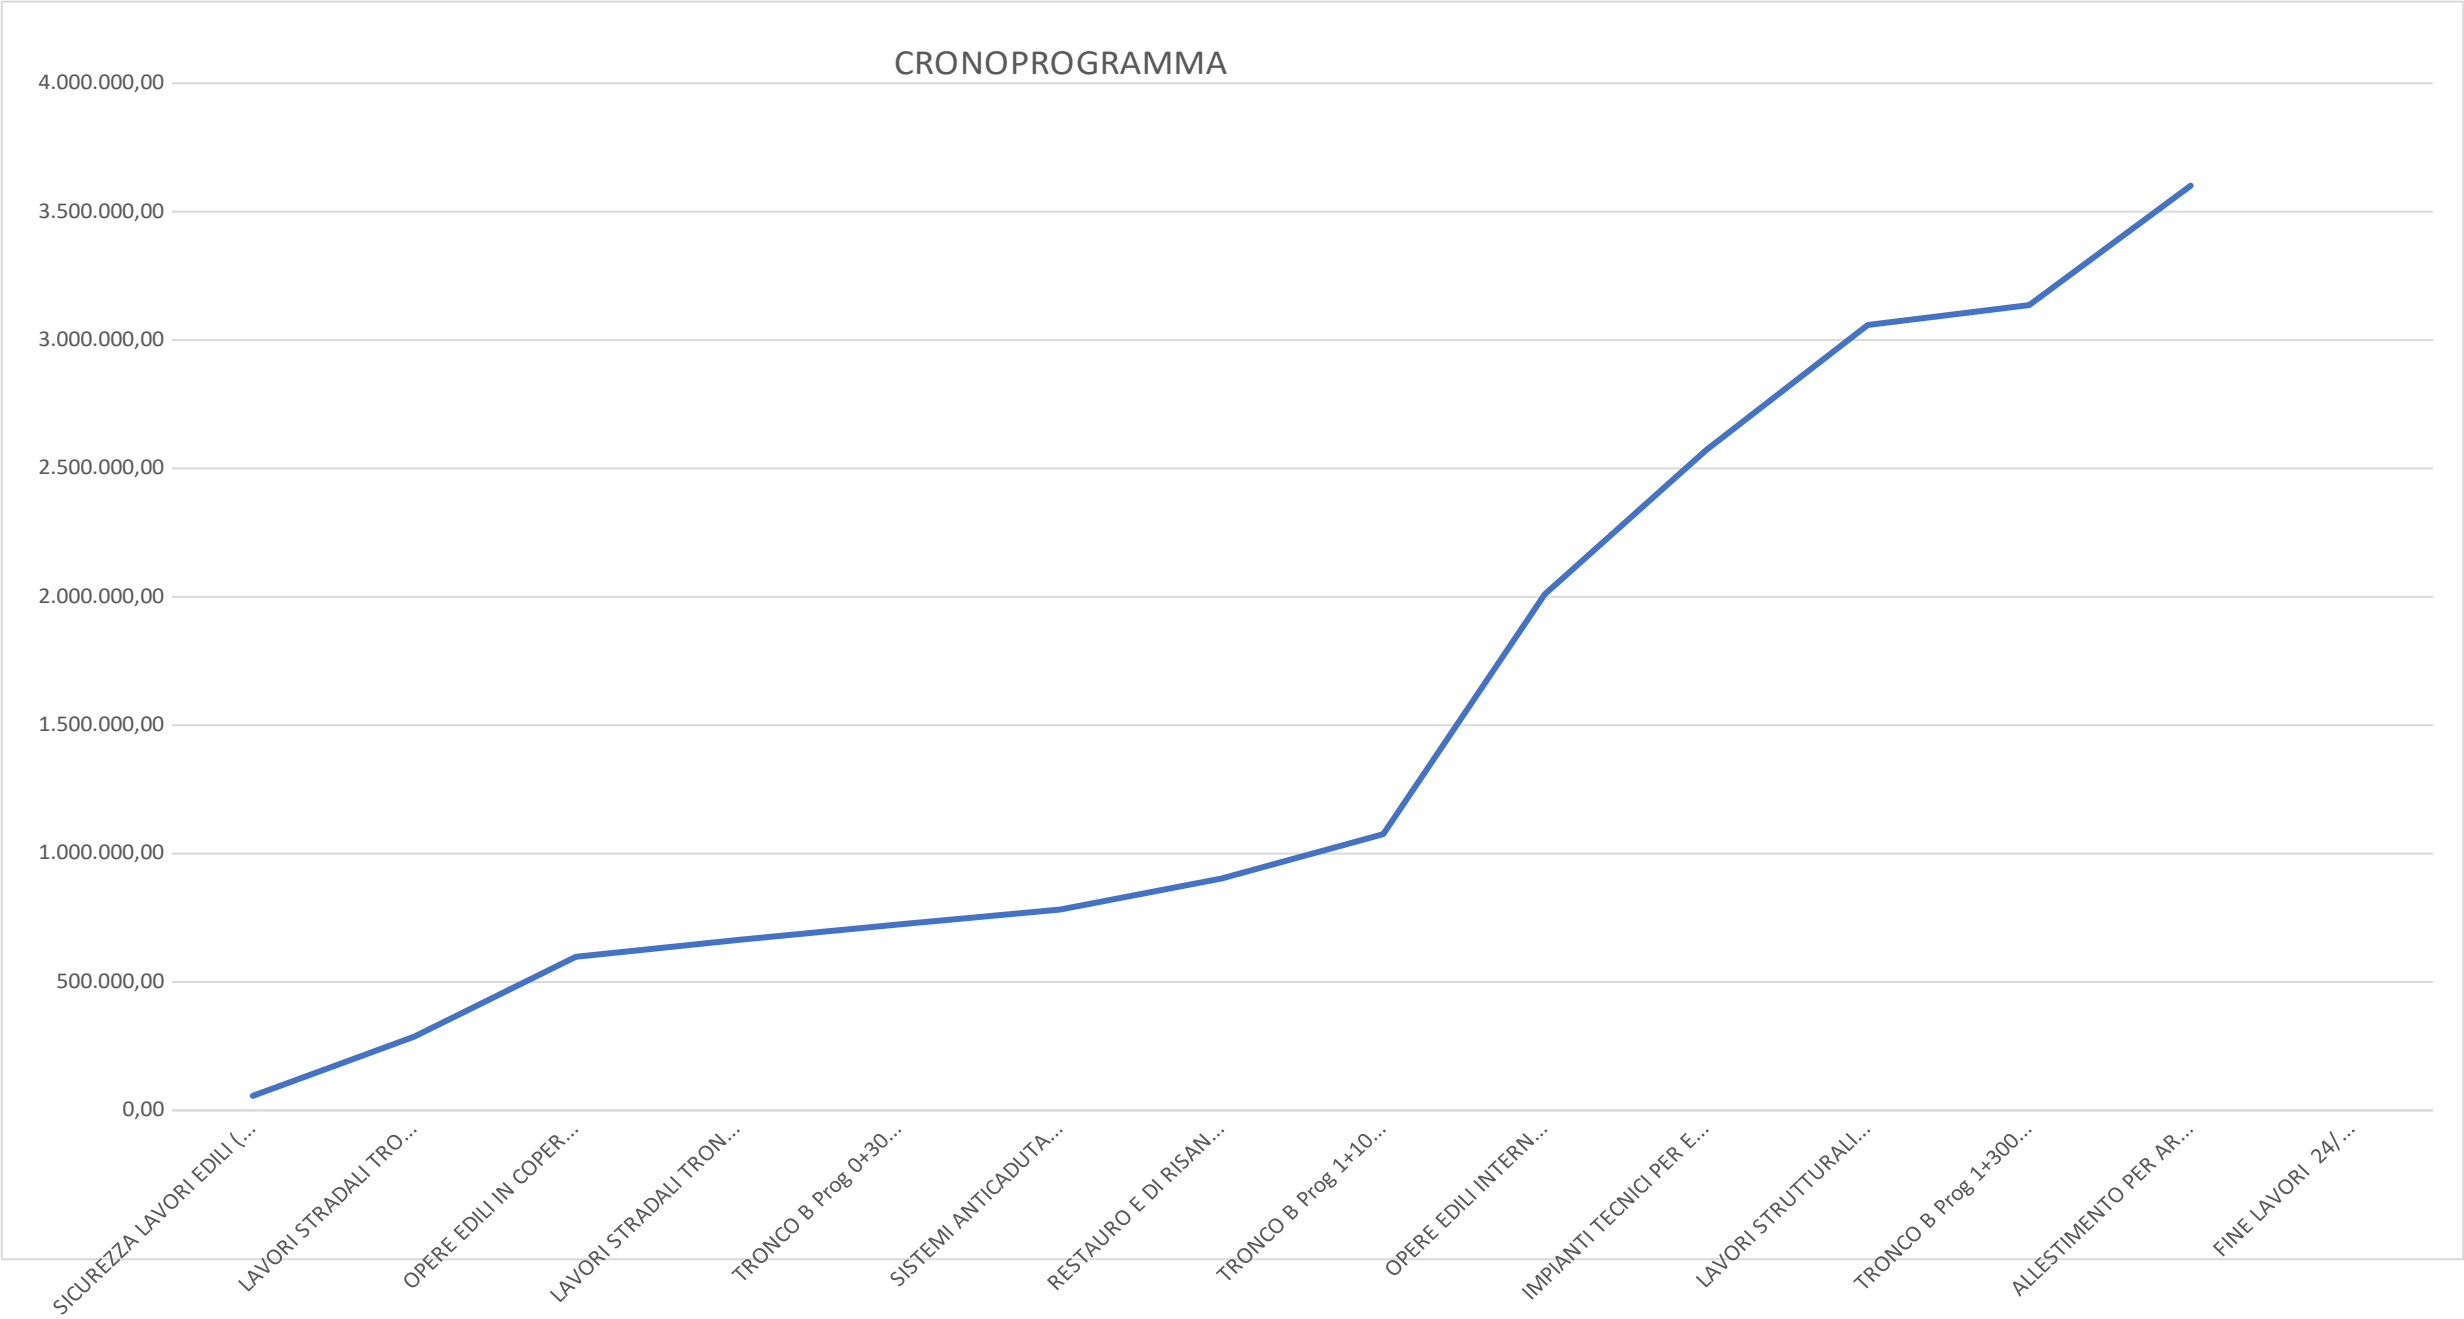



[illegible]

Pitture interne	19/08/2024	10
Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompati		10
IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI		185
Assistenze murarie per impianti	02/09/2024	21
Esecuzione di tracce eseguite a mano		21
Impianti idrico-sanitario e del gas		41
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric	03/09/2024	14
Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produ		15
Montaggio di apparecchi igienico sanitari		9
Posa di fossa biologica prefabbricata		3
Impianti elettrici	28/10/2024	44
Cablaggio elettrico		9
Realizzazione di impianto elettrico		30
Realizzazione di impianto di messa a terra		5
Impianti di condizionamento	02/01/2025	34
Posa della macchina di condizionamento		17
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata		17
Impianti solari fotovoltaici	27/01/2025	30
Installazione di sistema di accumulo		15
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico		15
Impianti antincendio	17/02/2025	15
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per im		10
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza		5
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI		107
Piantumazione e posa superfici verdi	25/03/2025	20
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie		5
Messa a dimora di piante		15
Pavimentazioni esterne	07/04/2025	76
Disfacimento di pavimentazione in pietra		5
Scavo a sezione obbligatoria in terreni incoerenti		9
Realizzazione di vespaio aerato in pietrame		22
Realizzazione di muretti a secco		25
Posa di pavimenti per esterni in pietra		15
Smobilizzo del cantiere	16/06/2025	11
Smontaggio del ponteggio metallico fisso		5
Smobilizzo del cantiere		3
Pulizia generale dell'area di cantiere		3


[illegible]


[illegible]

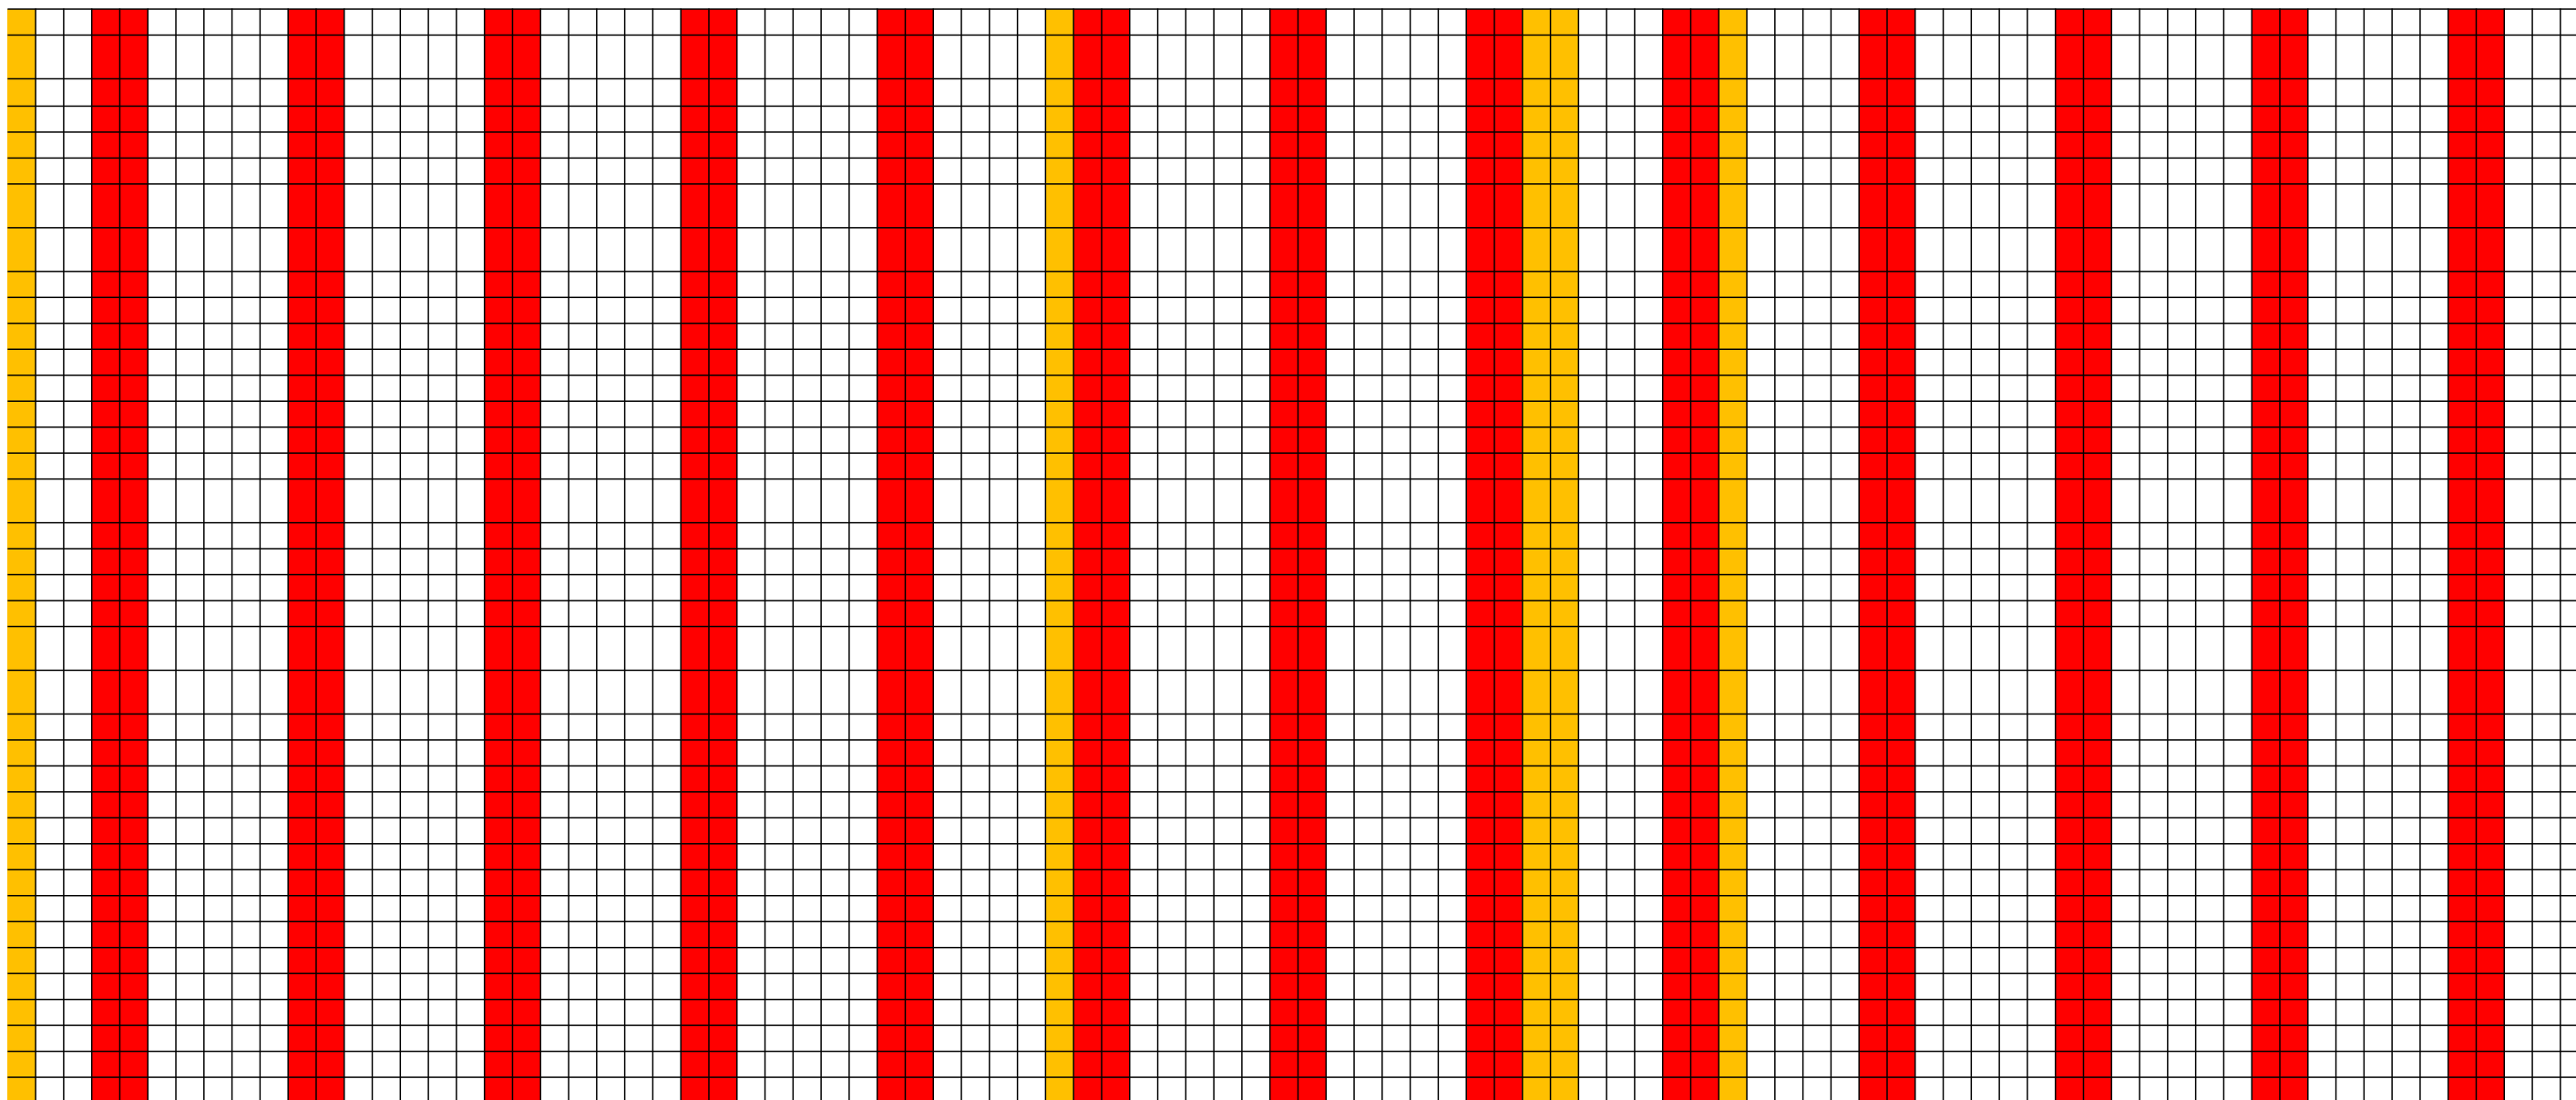

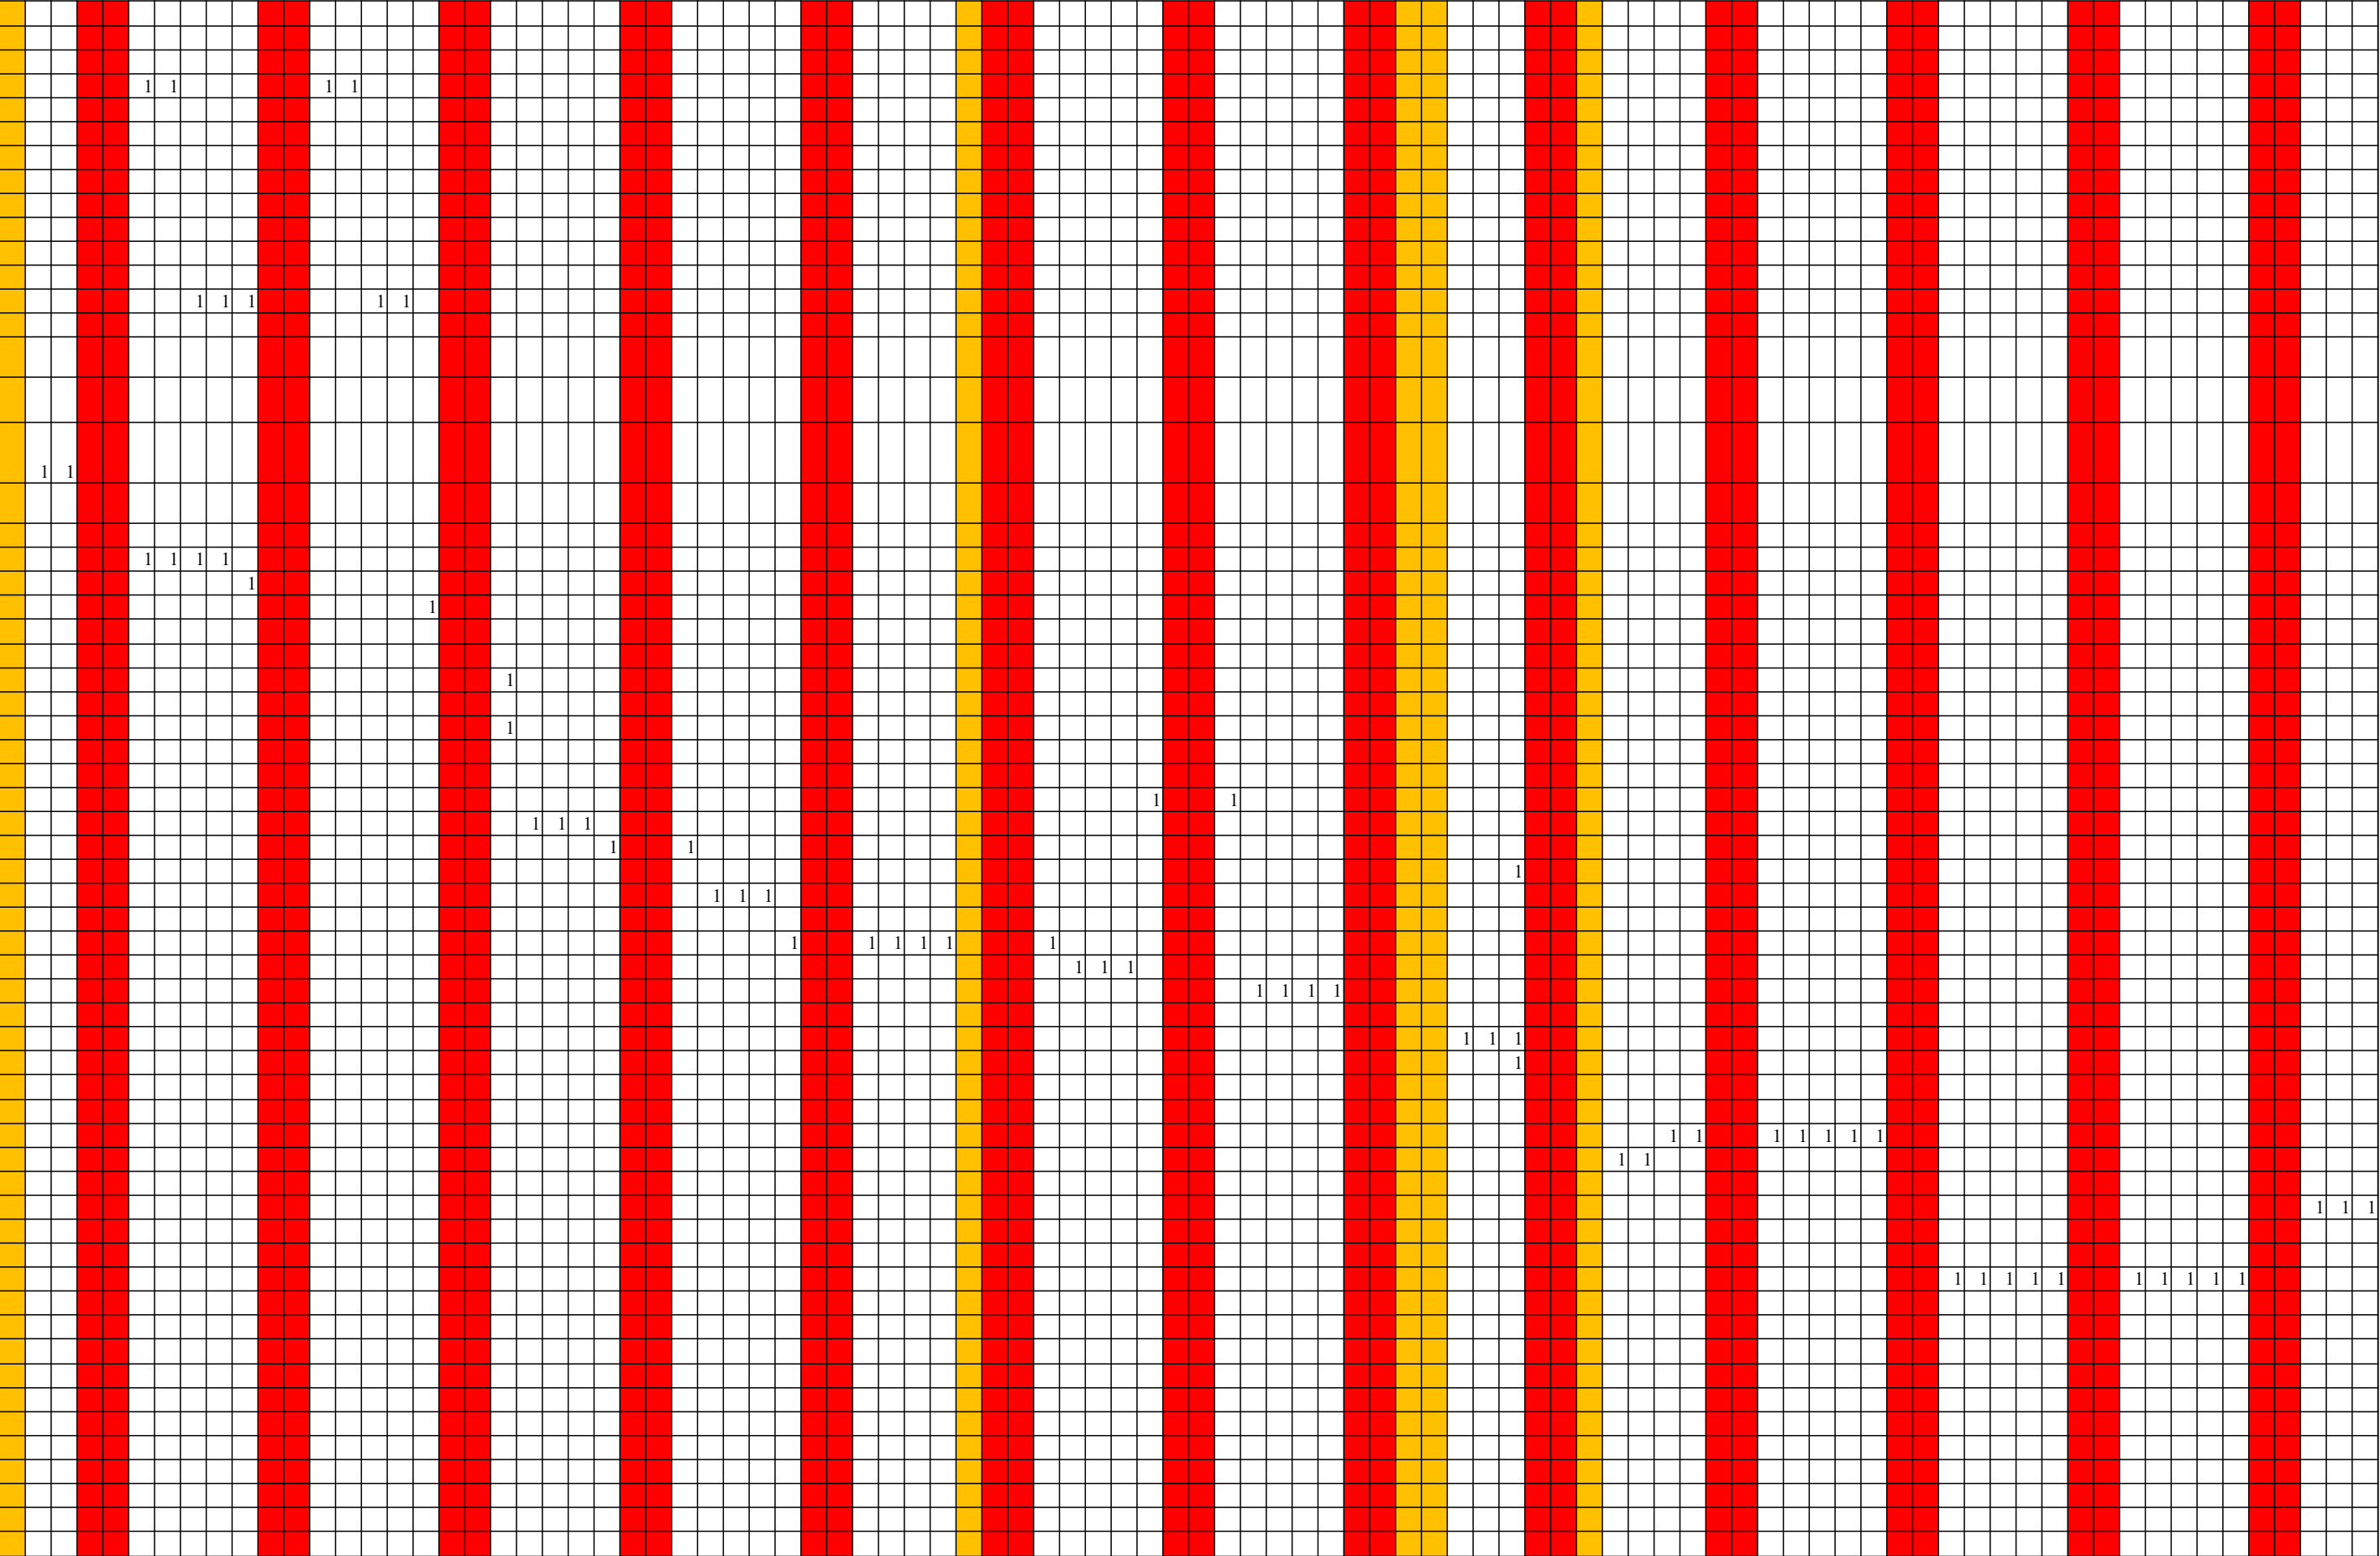



[illegible]

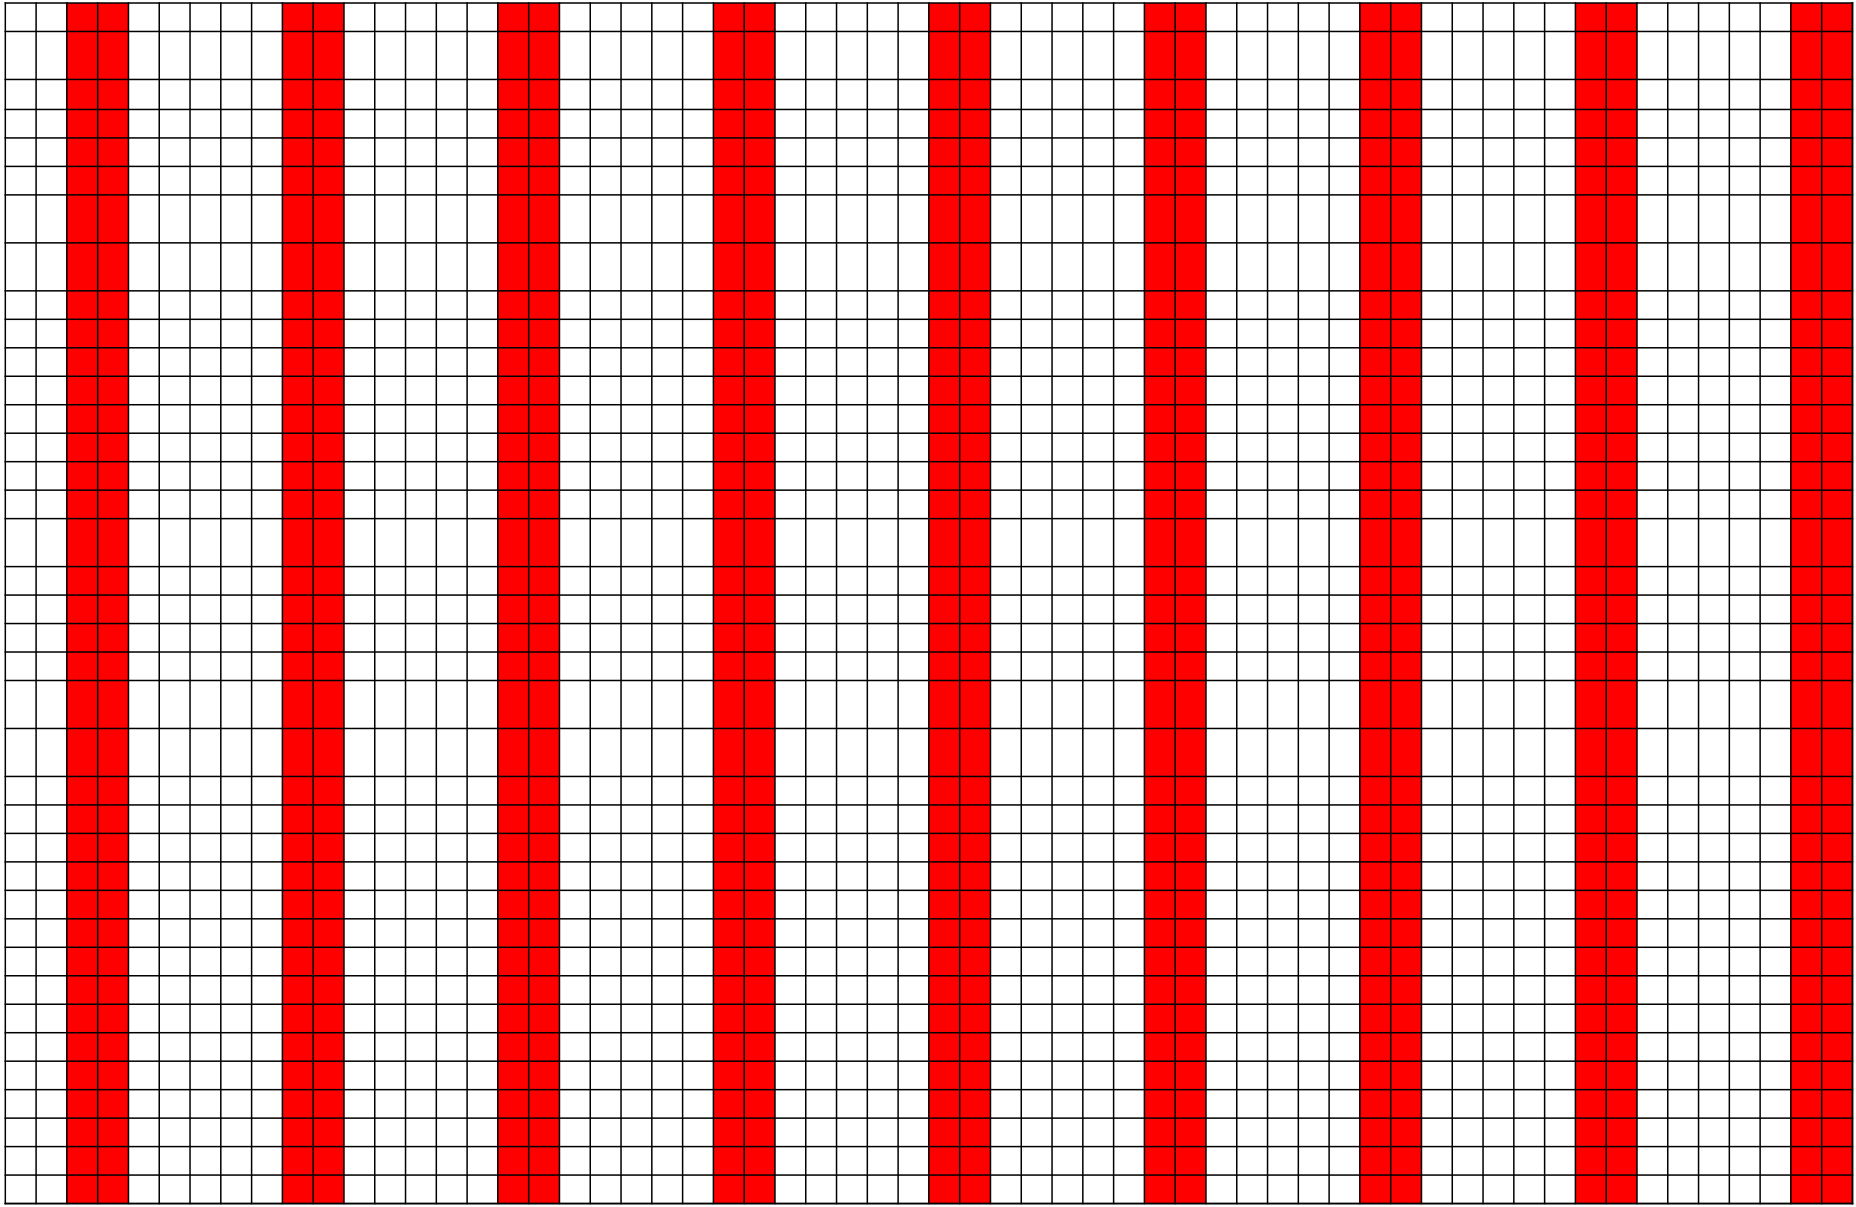

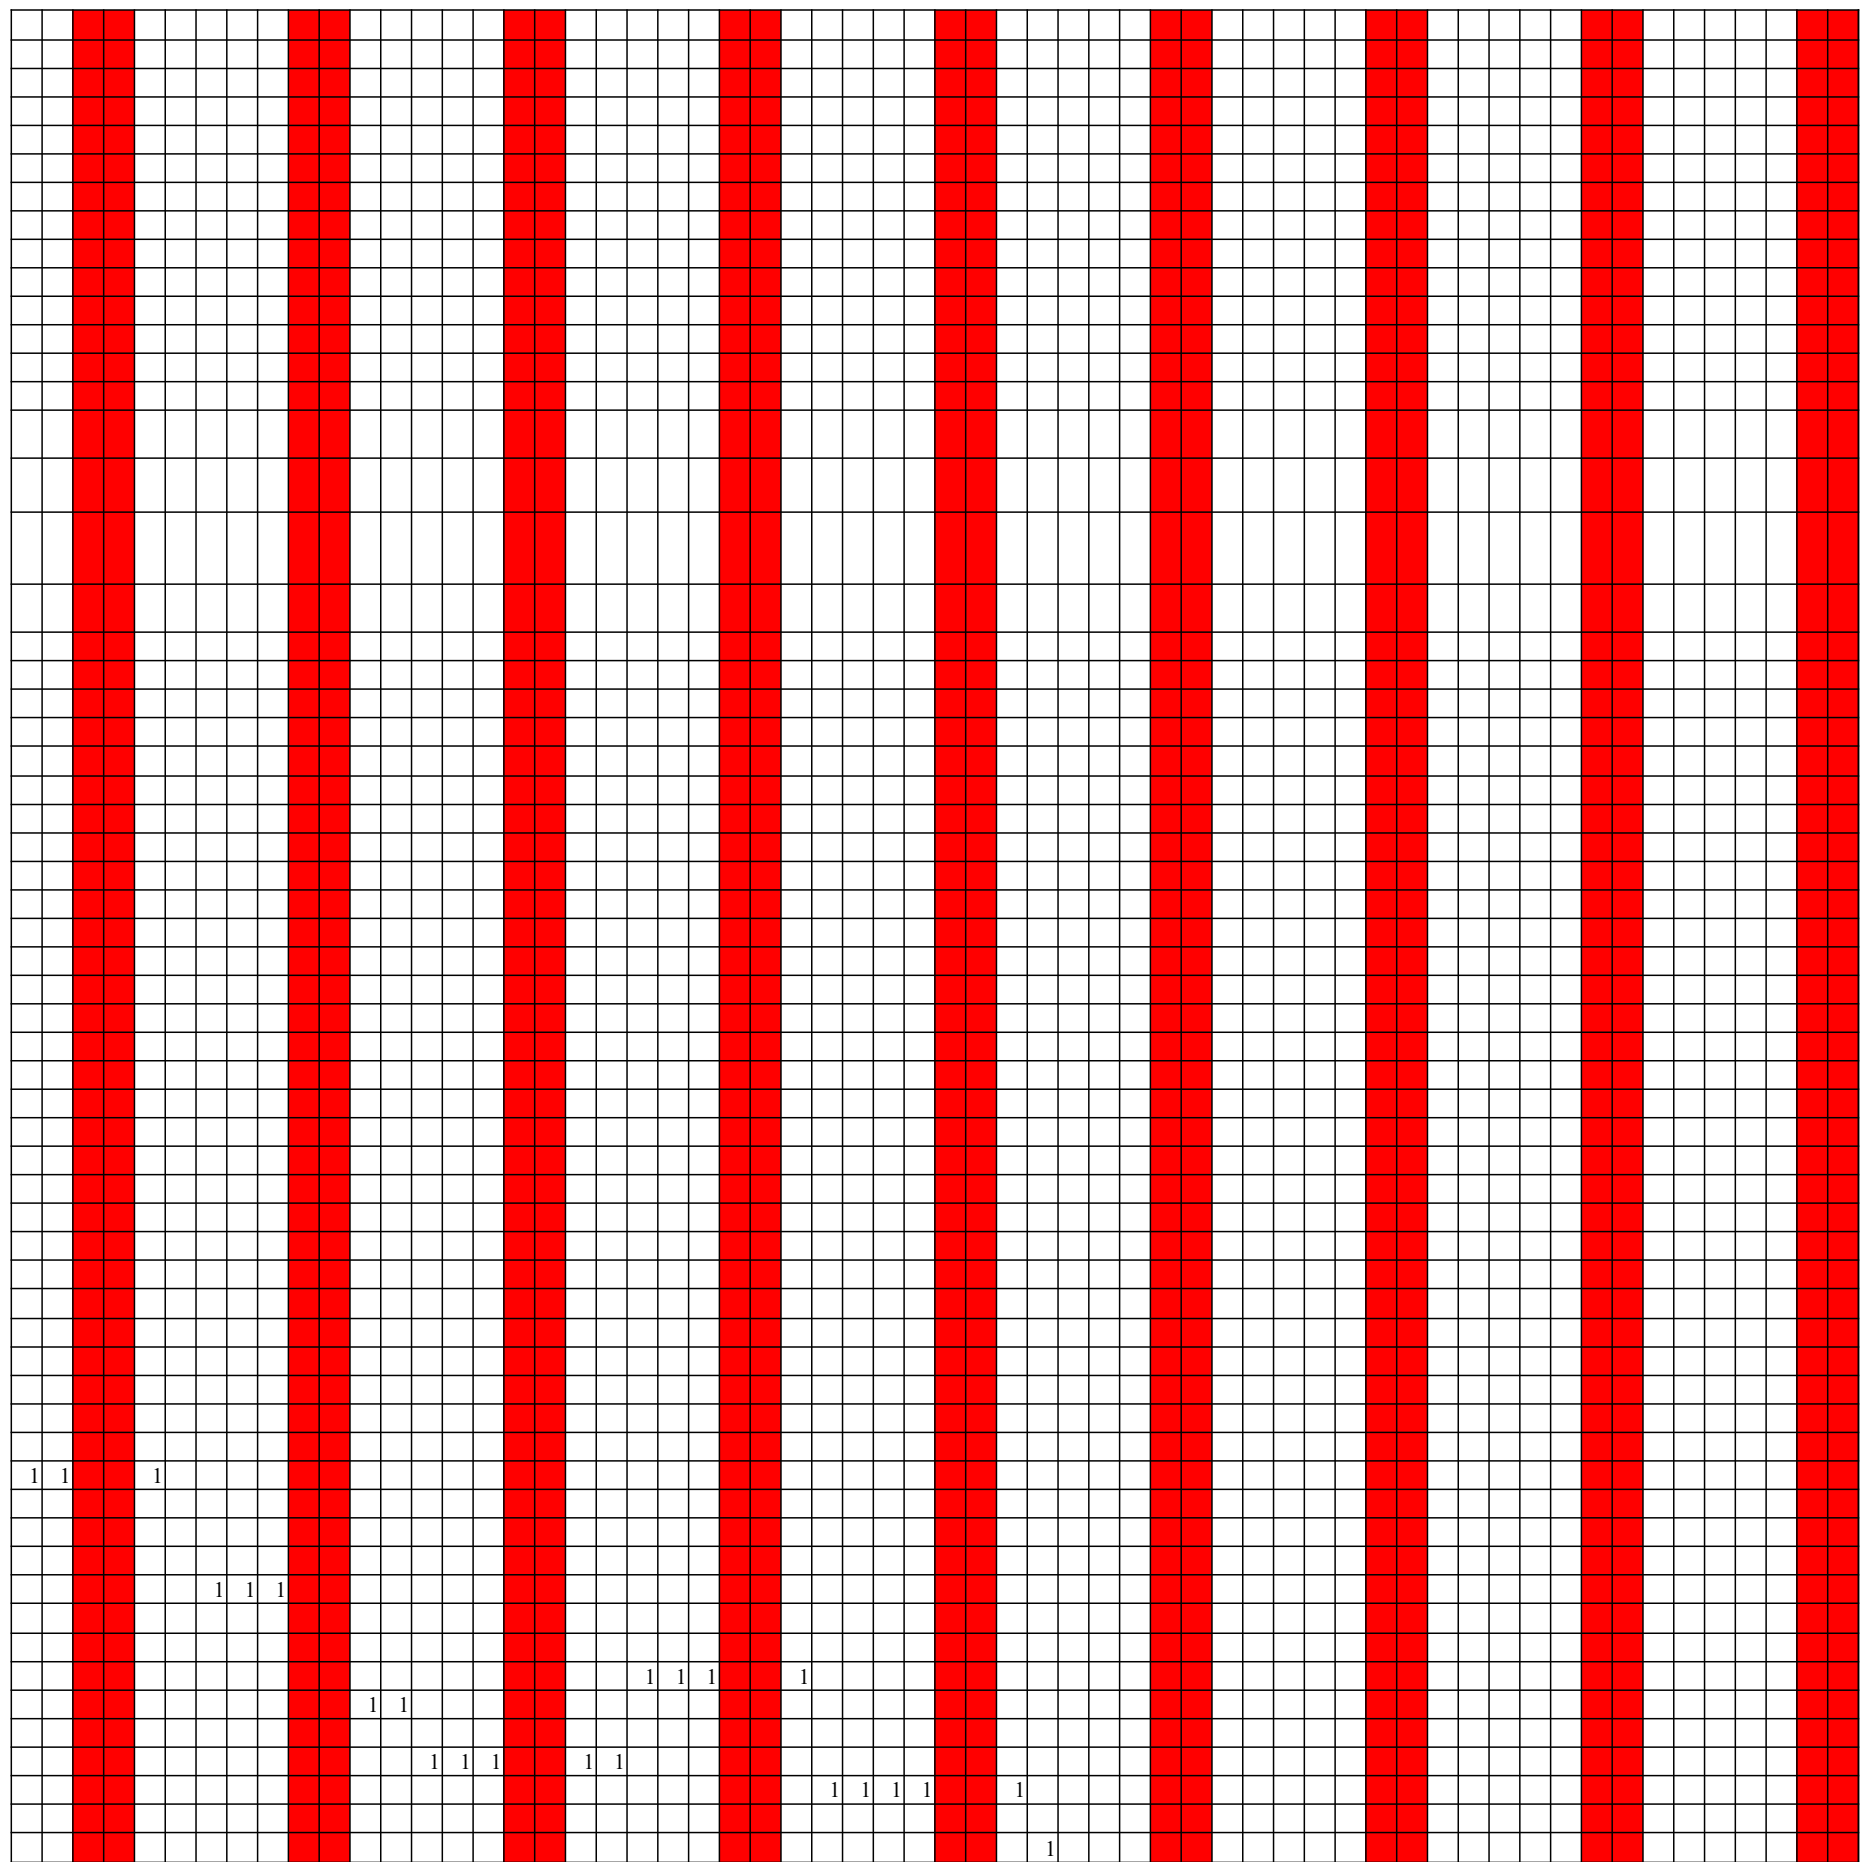



The figure displays a 31x31 grid representing a calendar for April 2024. The grid is divided into two main sections: 'apr-24' (left) and 'mag-24' (right). The grid is color-coded: red for days 6-7, 13-14, 20-21, 27-28, 11-12, 18-19, and 25-26; yellow for days 25 and 30; and white for all other days. The grid is labeled with days of the month (1-31) along the top and left edges.

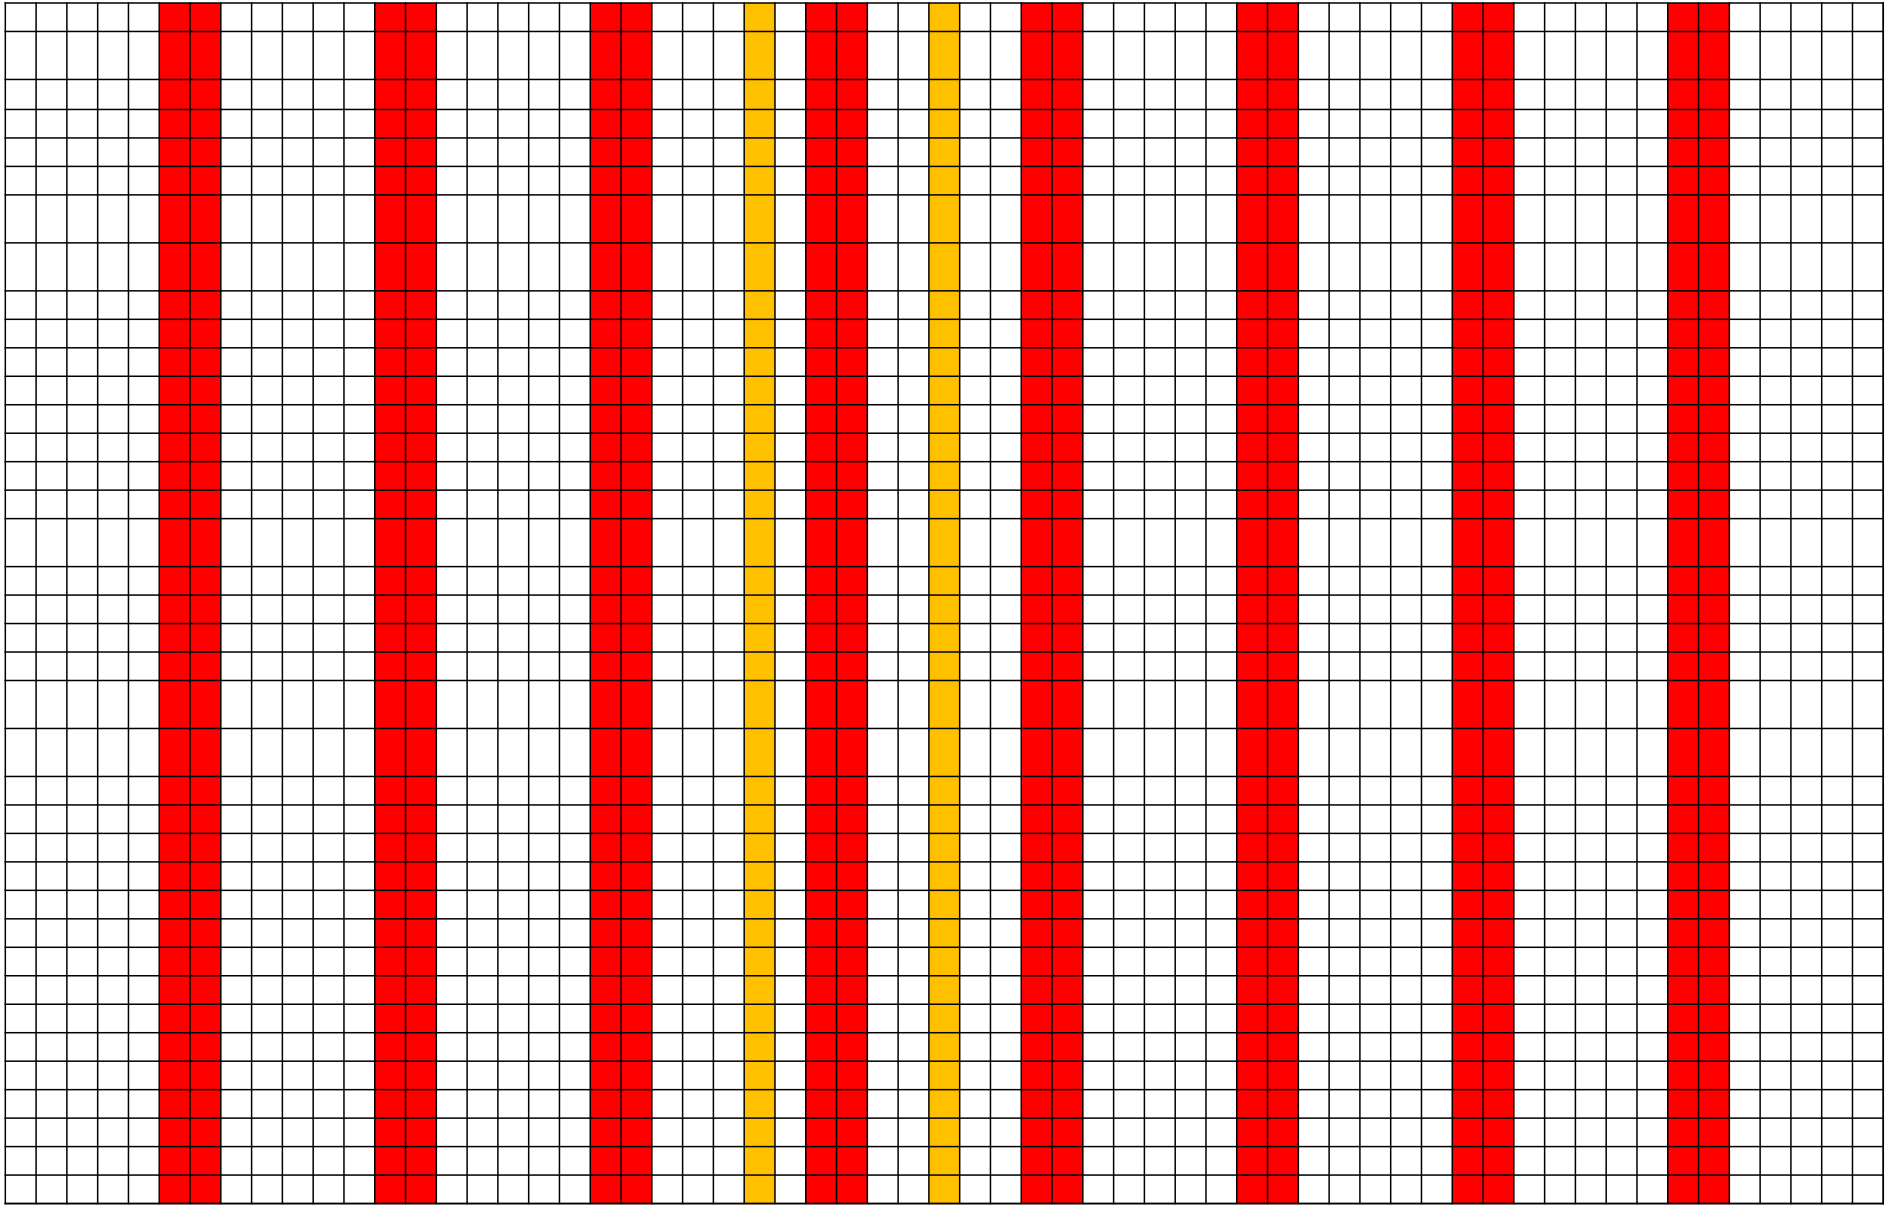

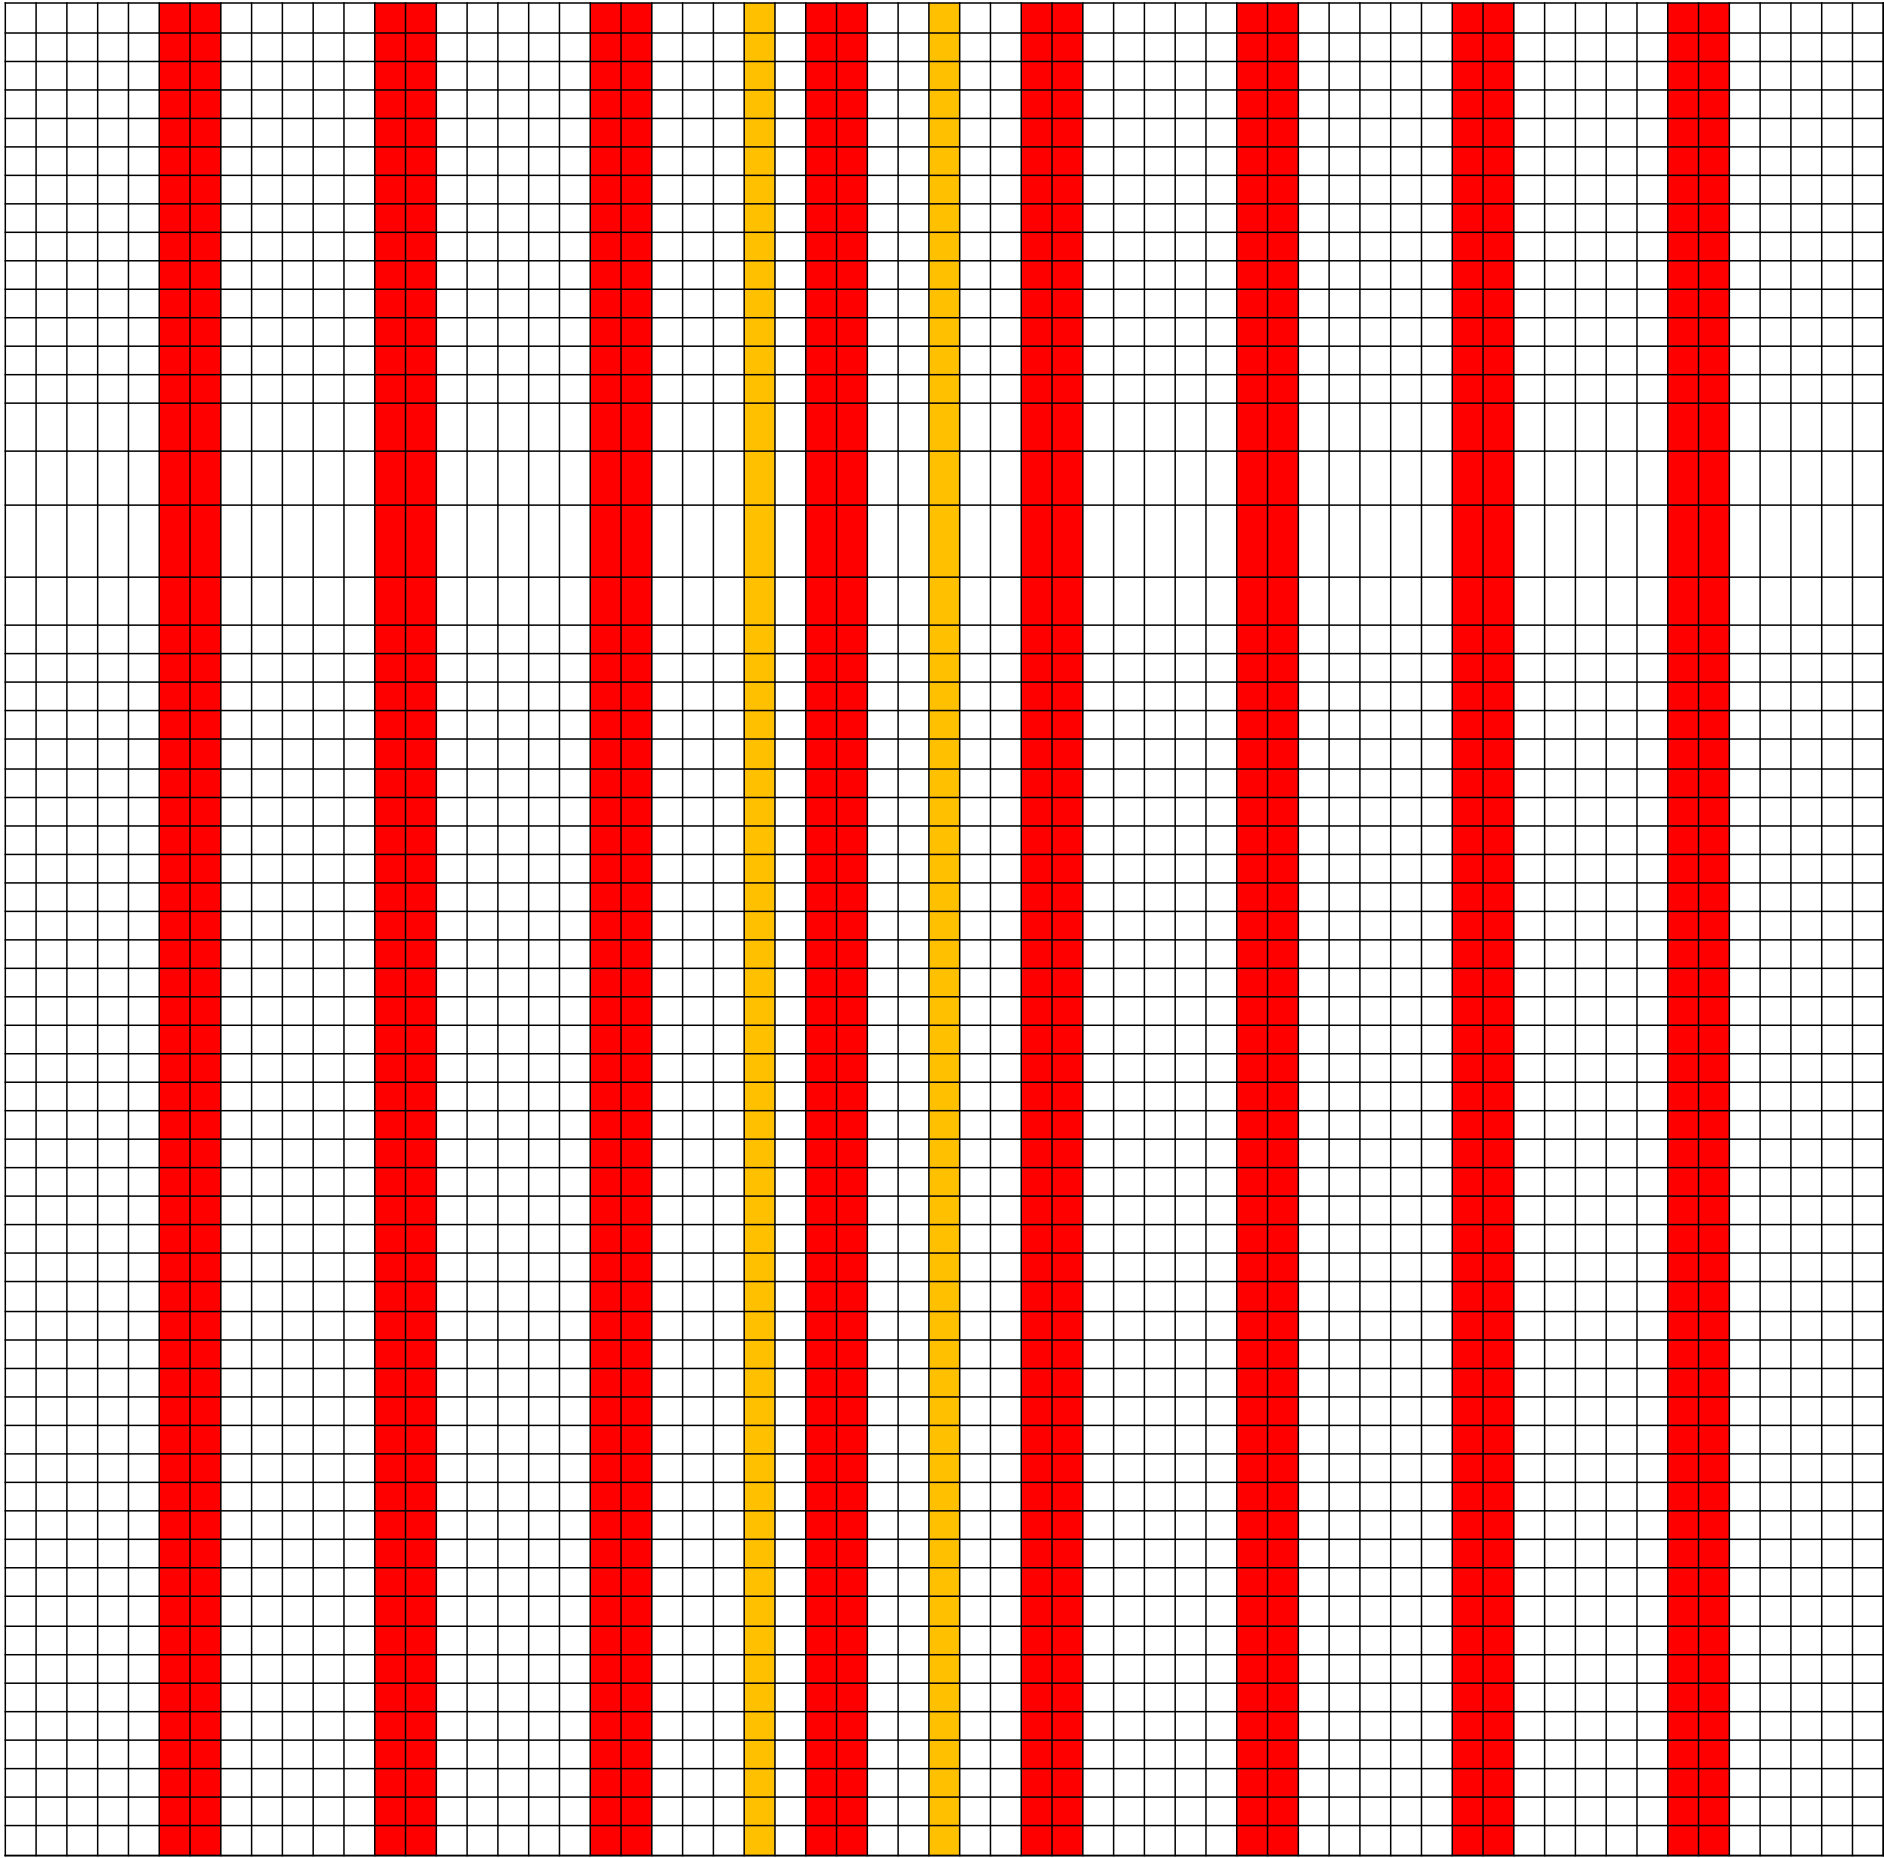


[illegible]

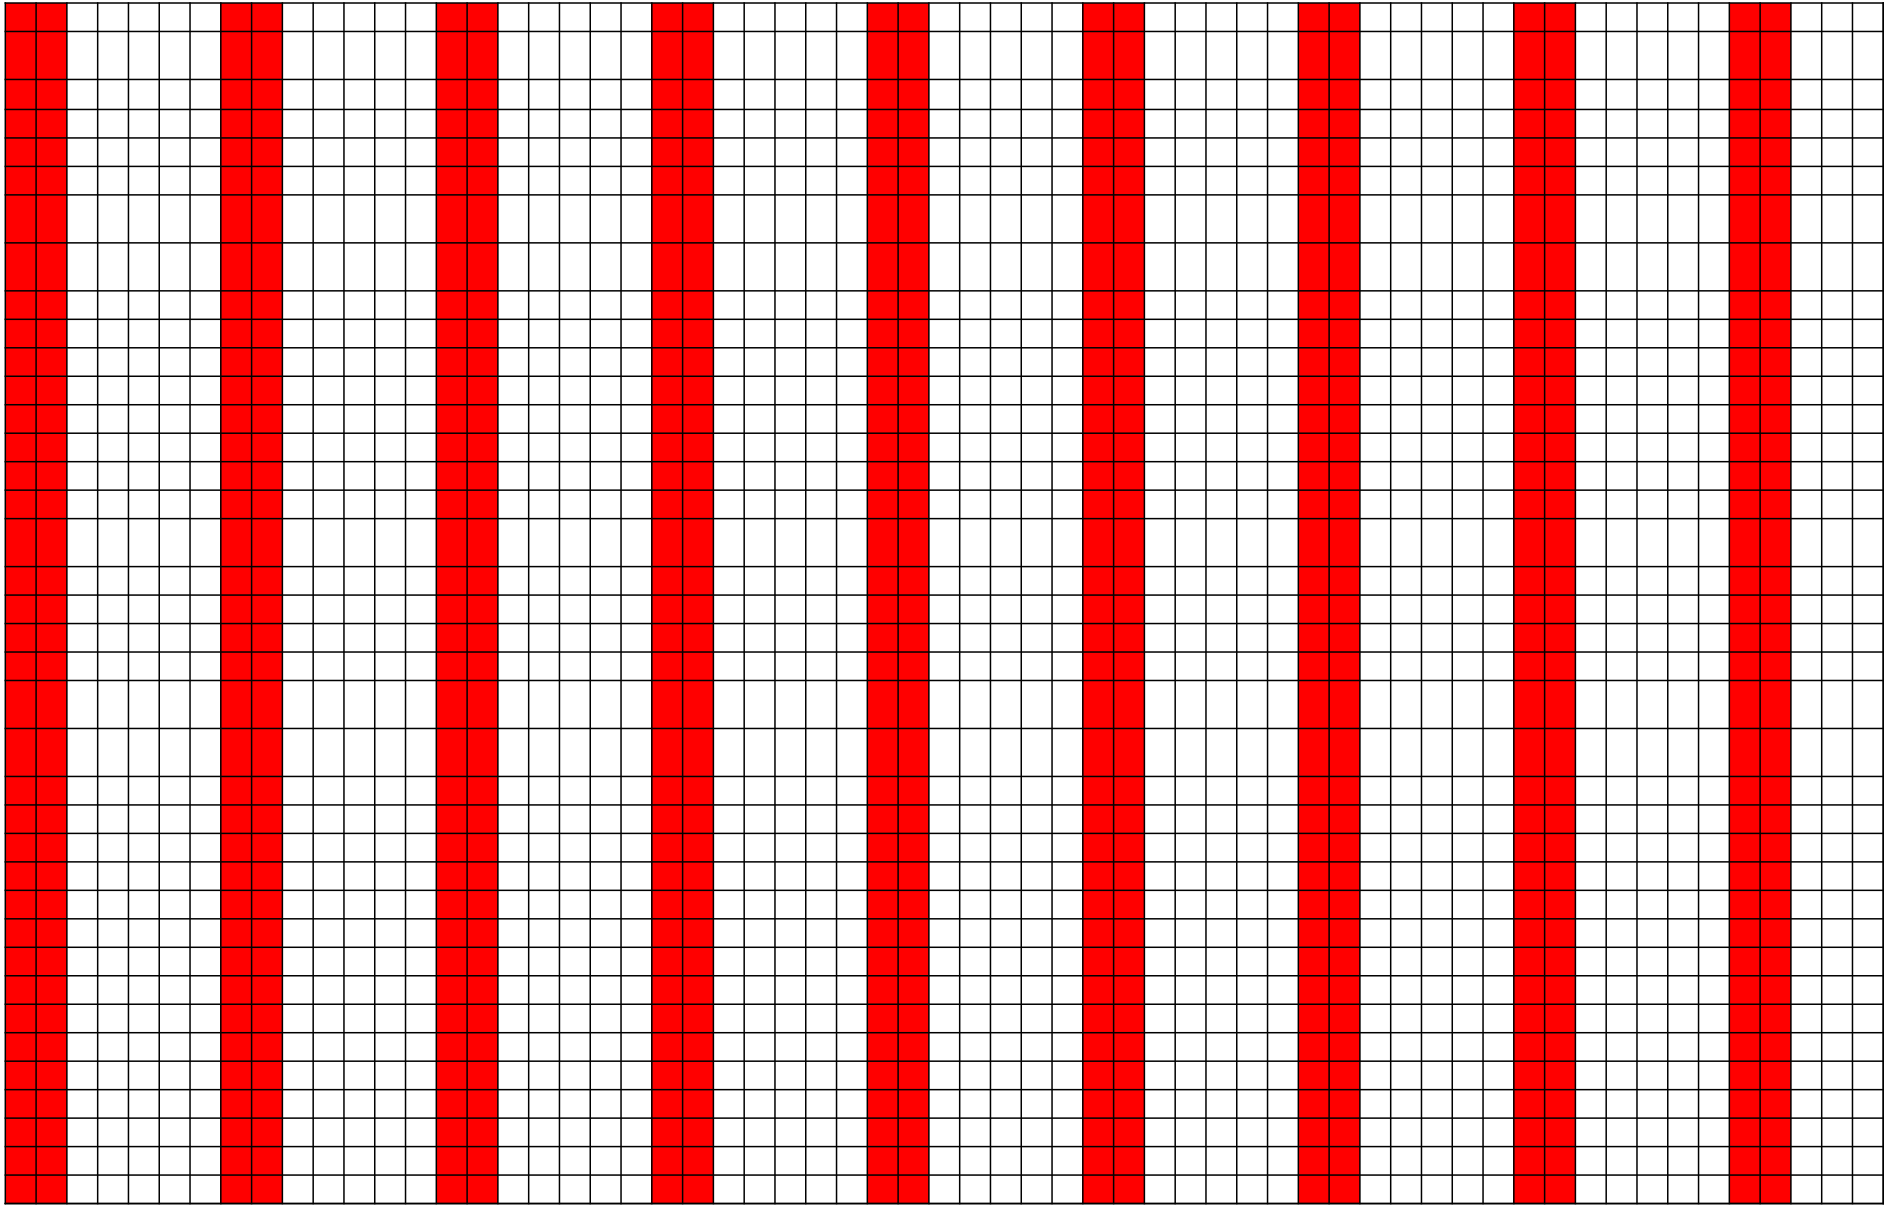

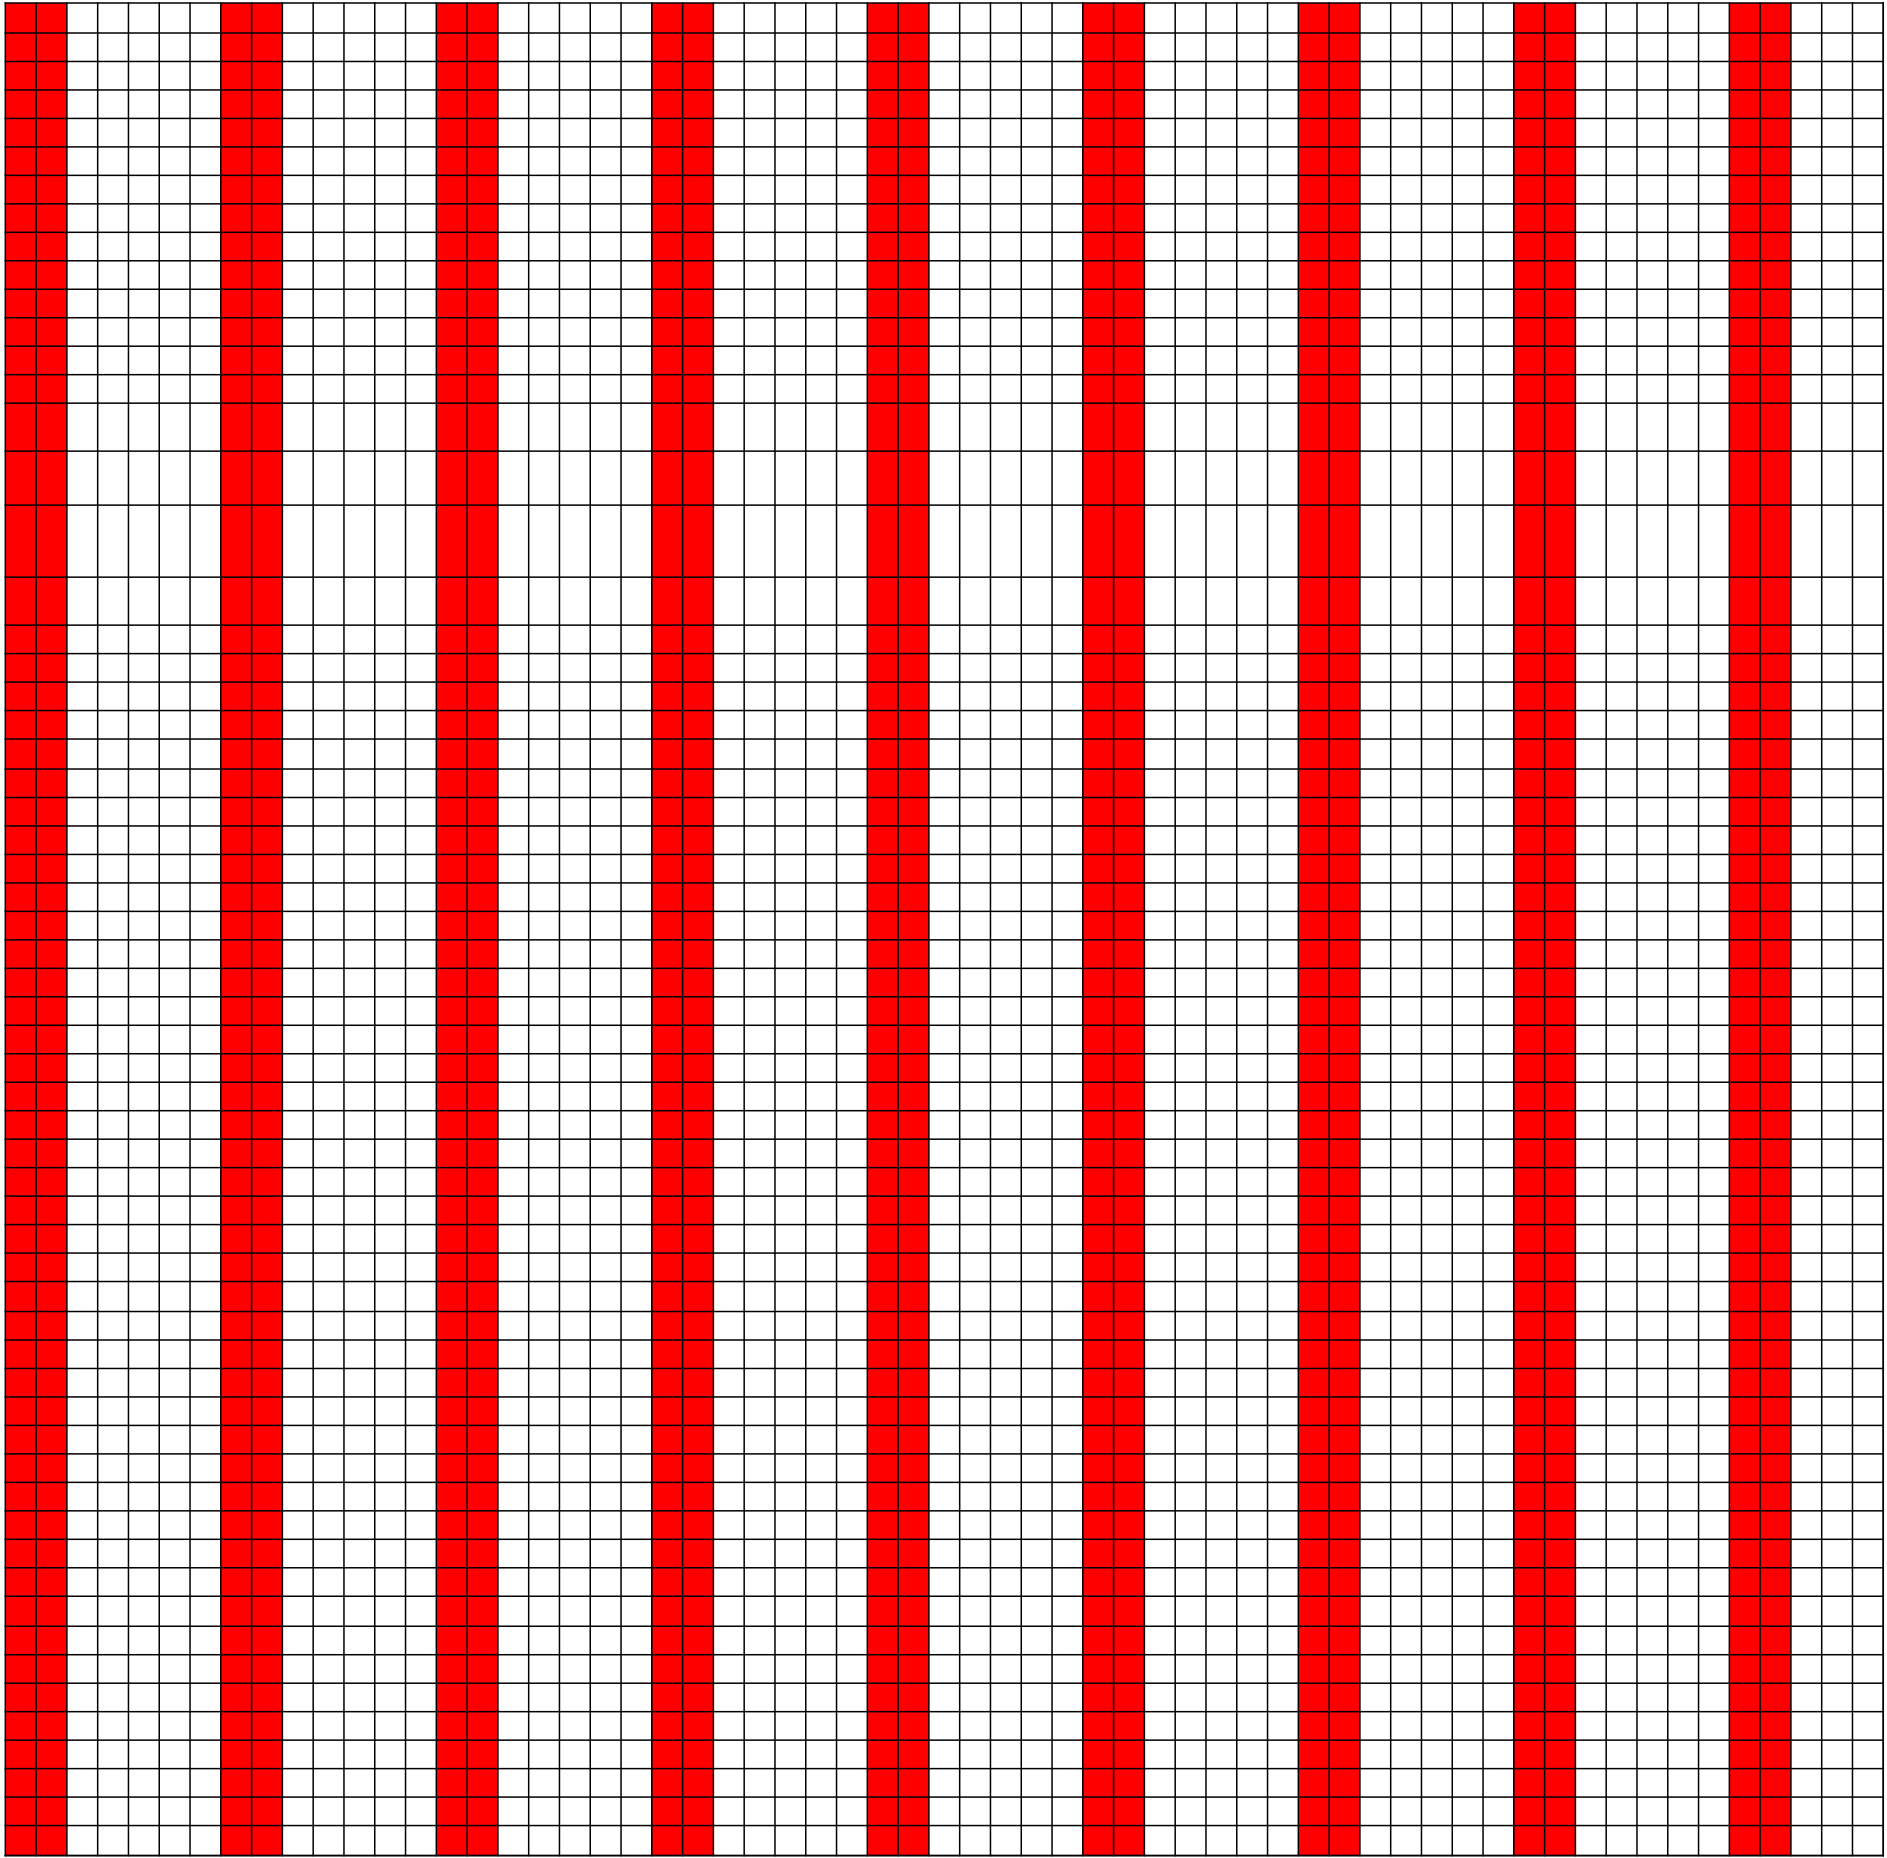



[illegible]

[illegible]

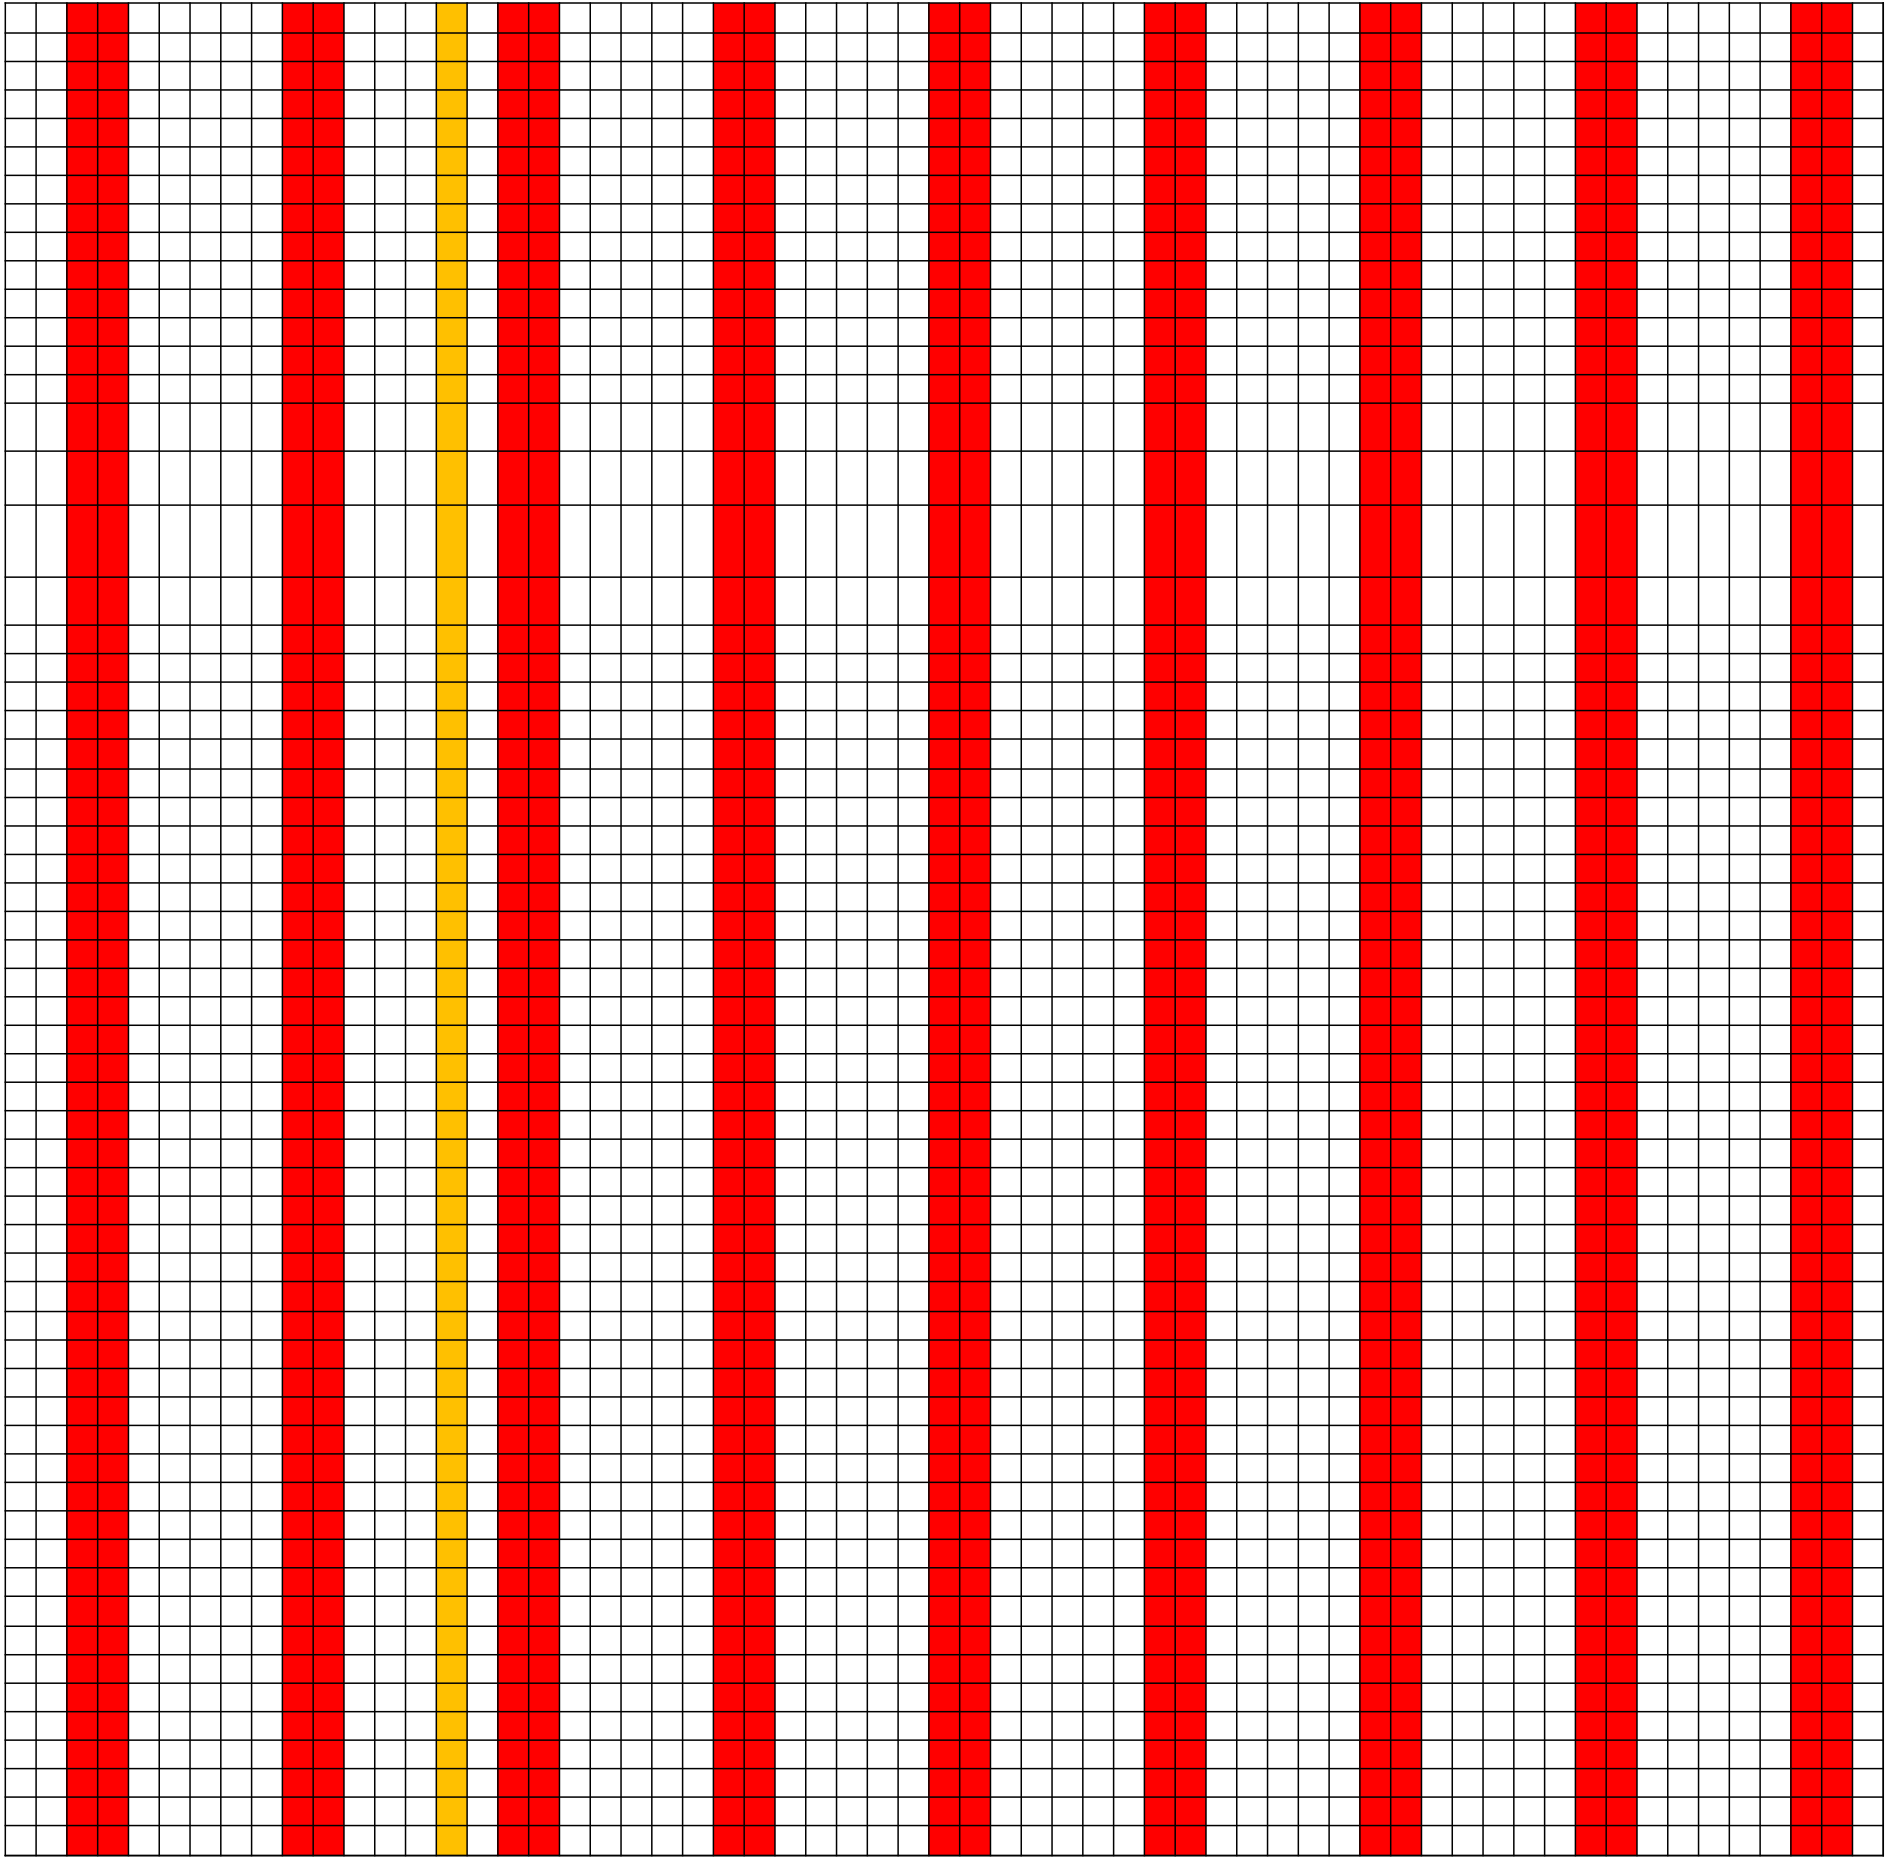



[illegible]

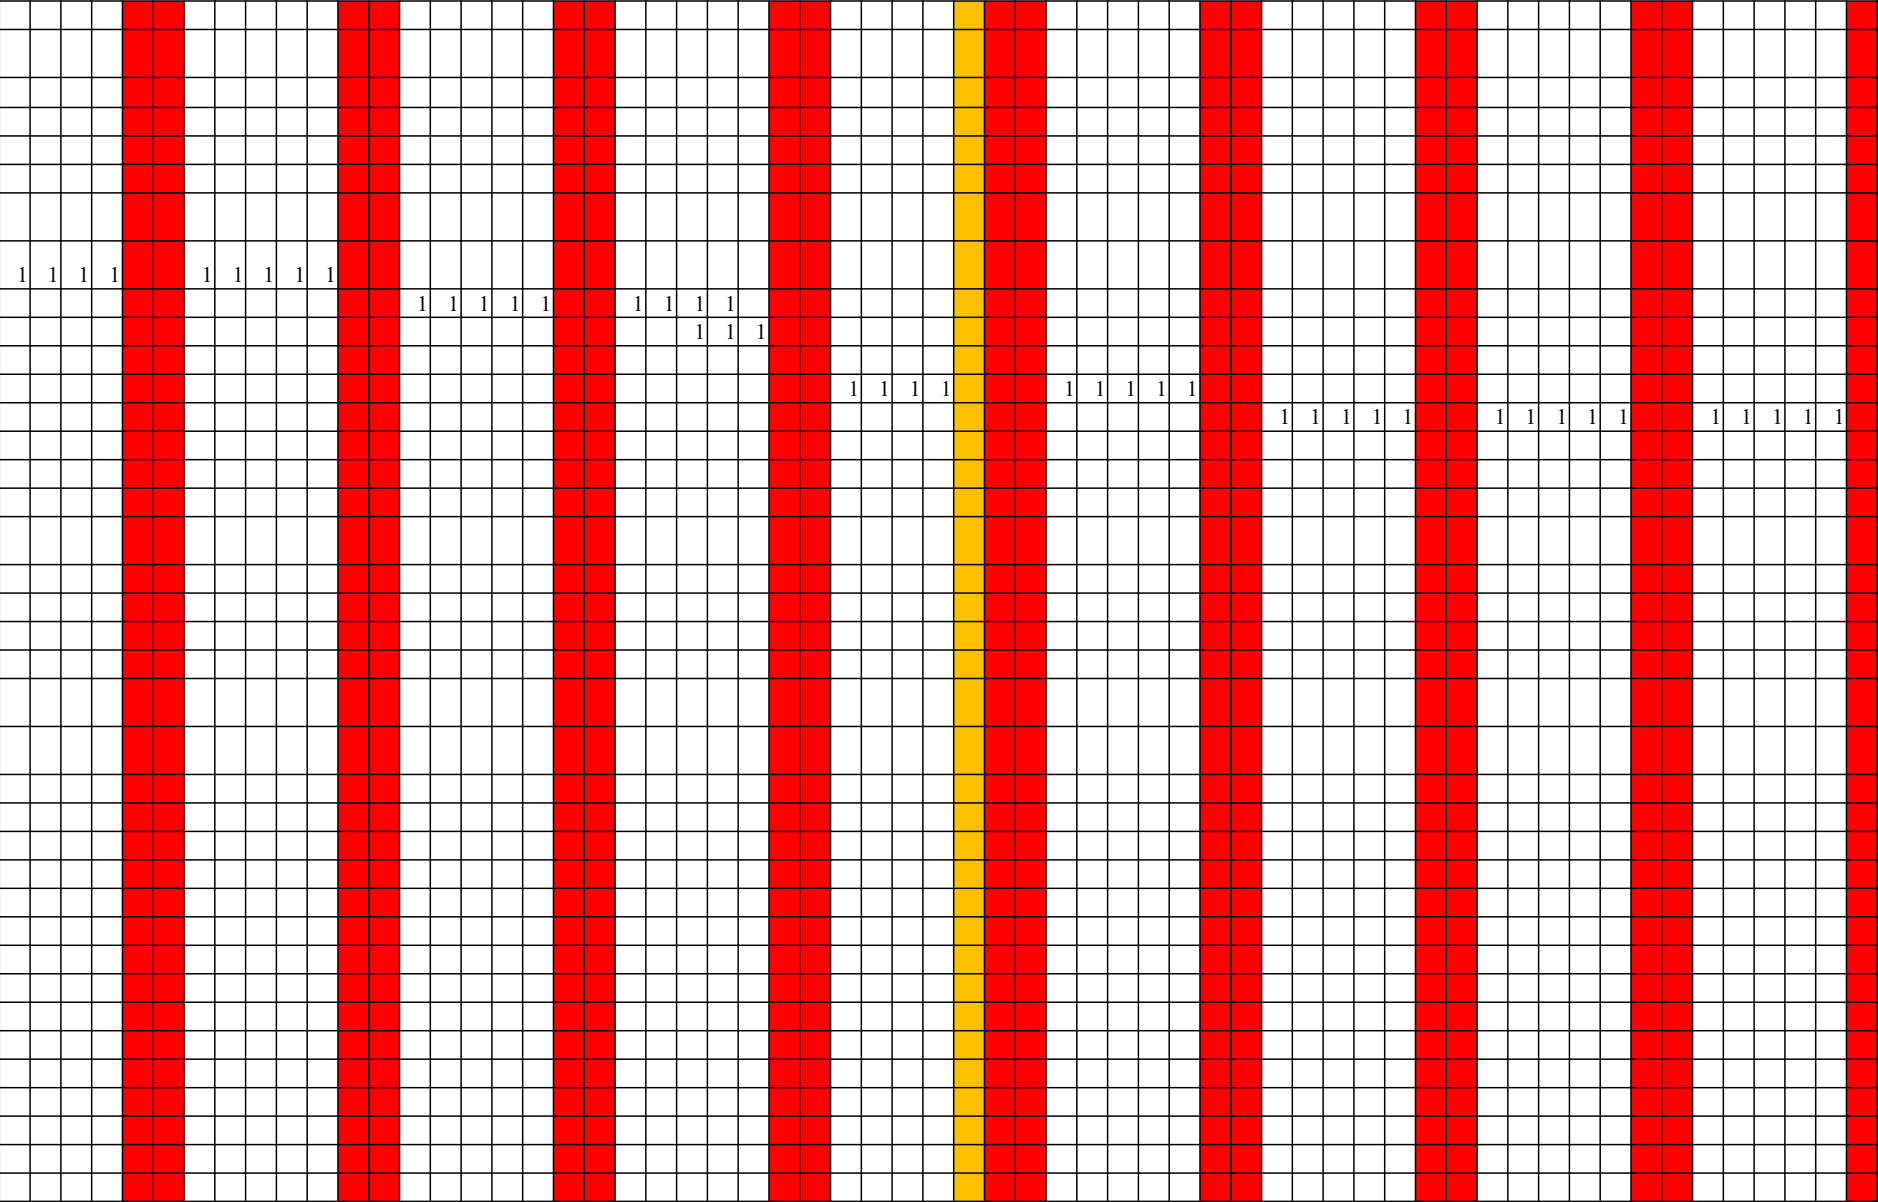





[illegible]

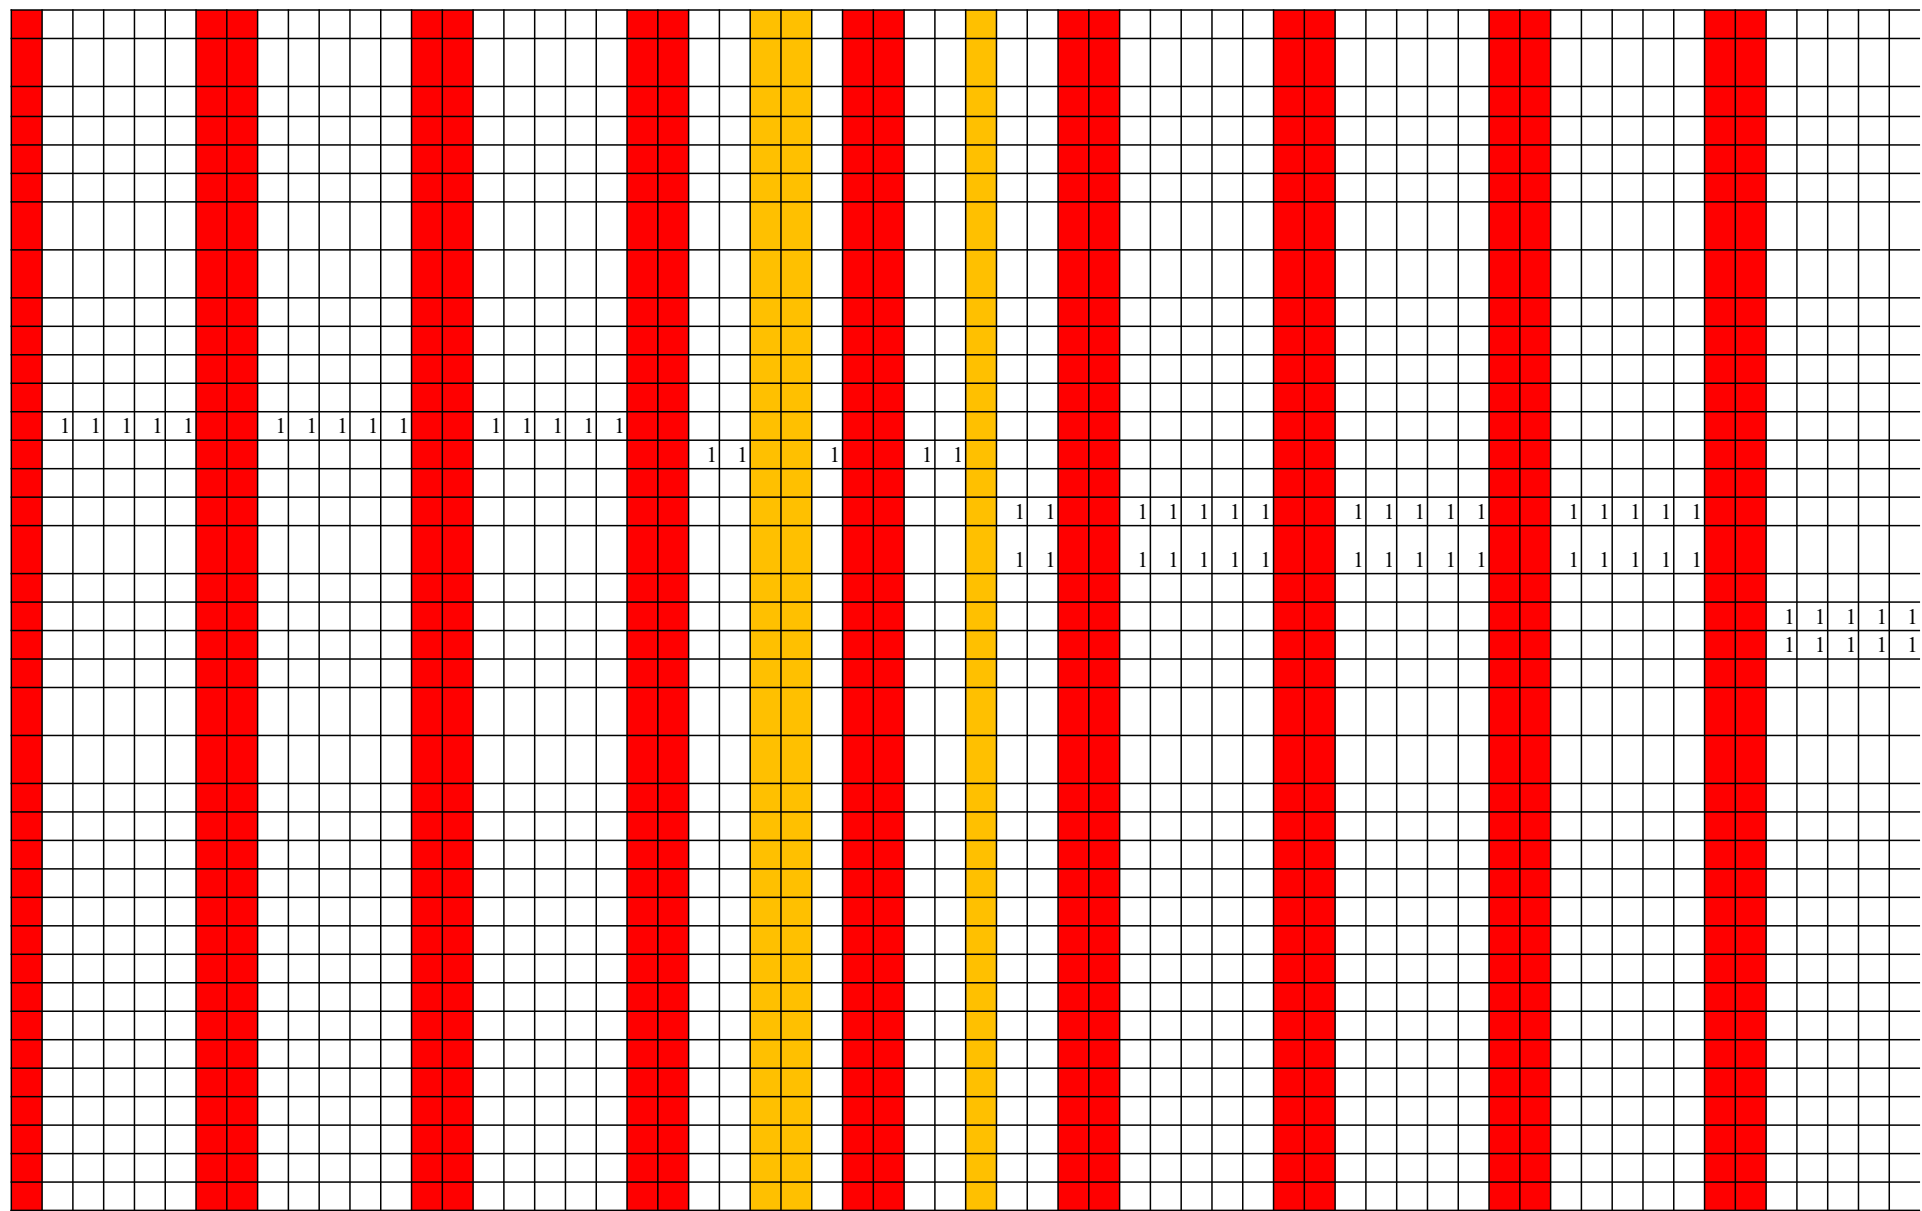

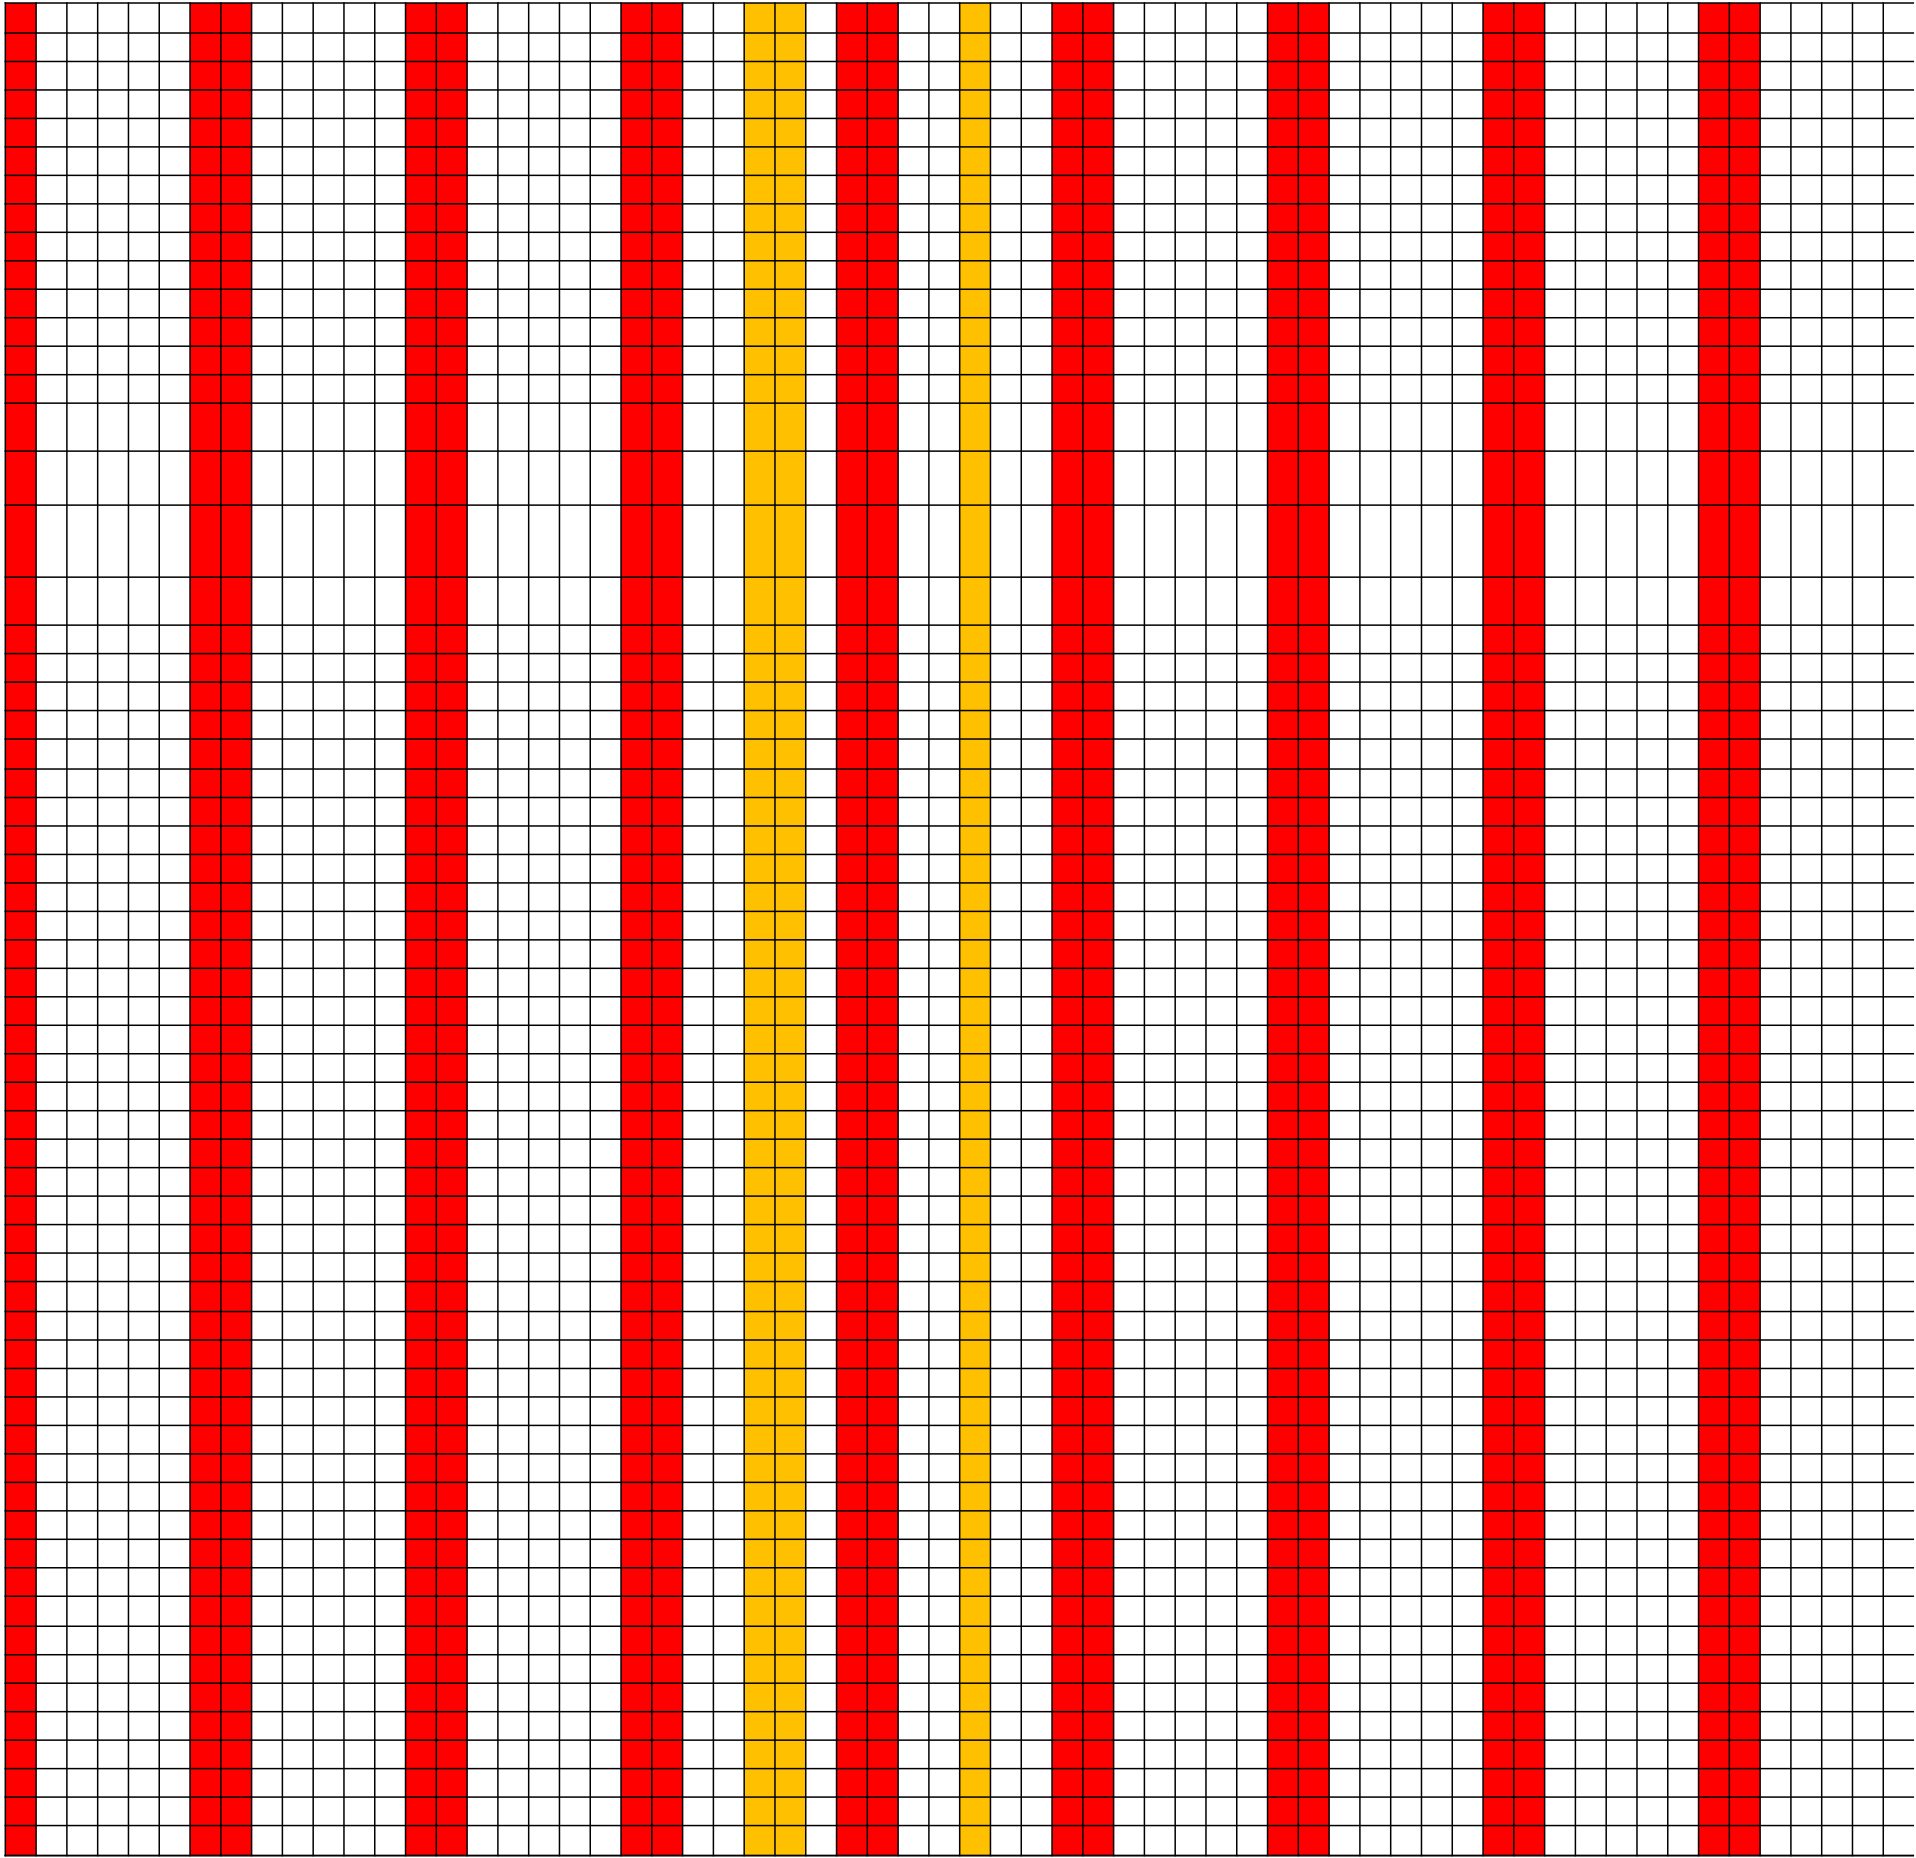



[illegible]

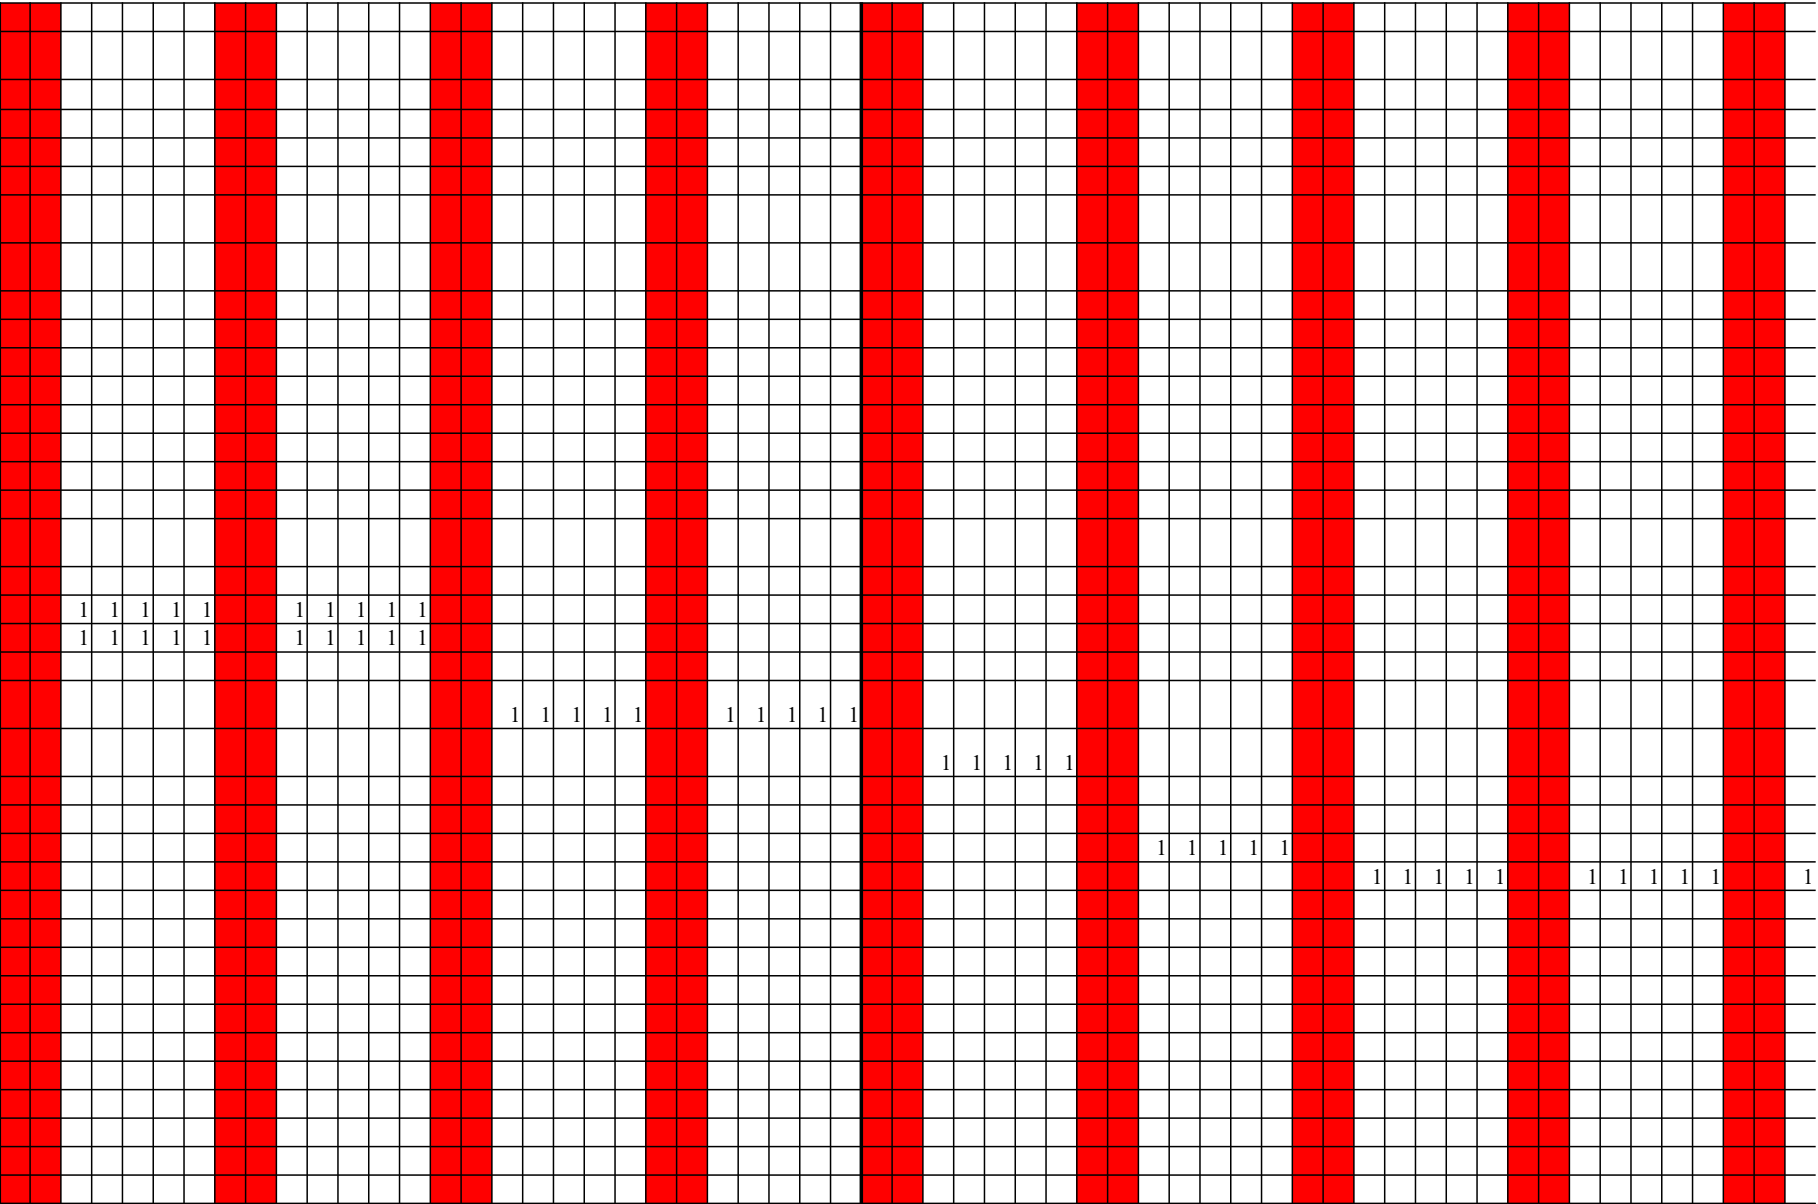

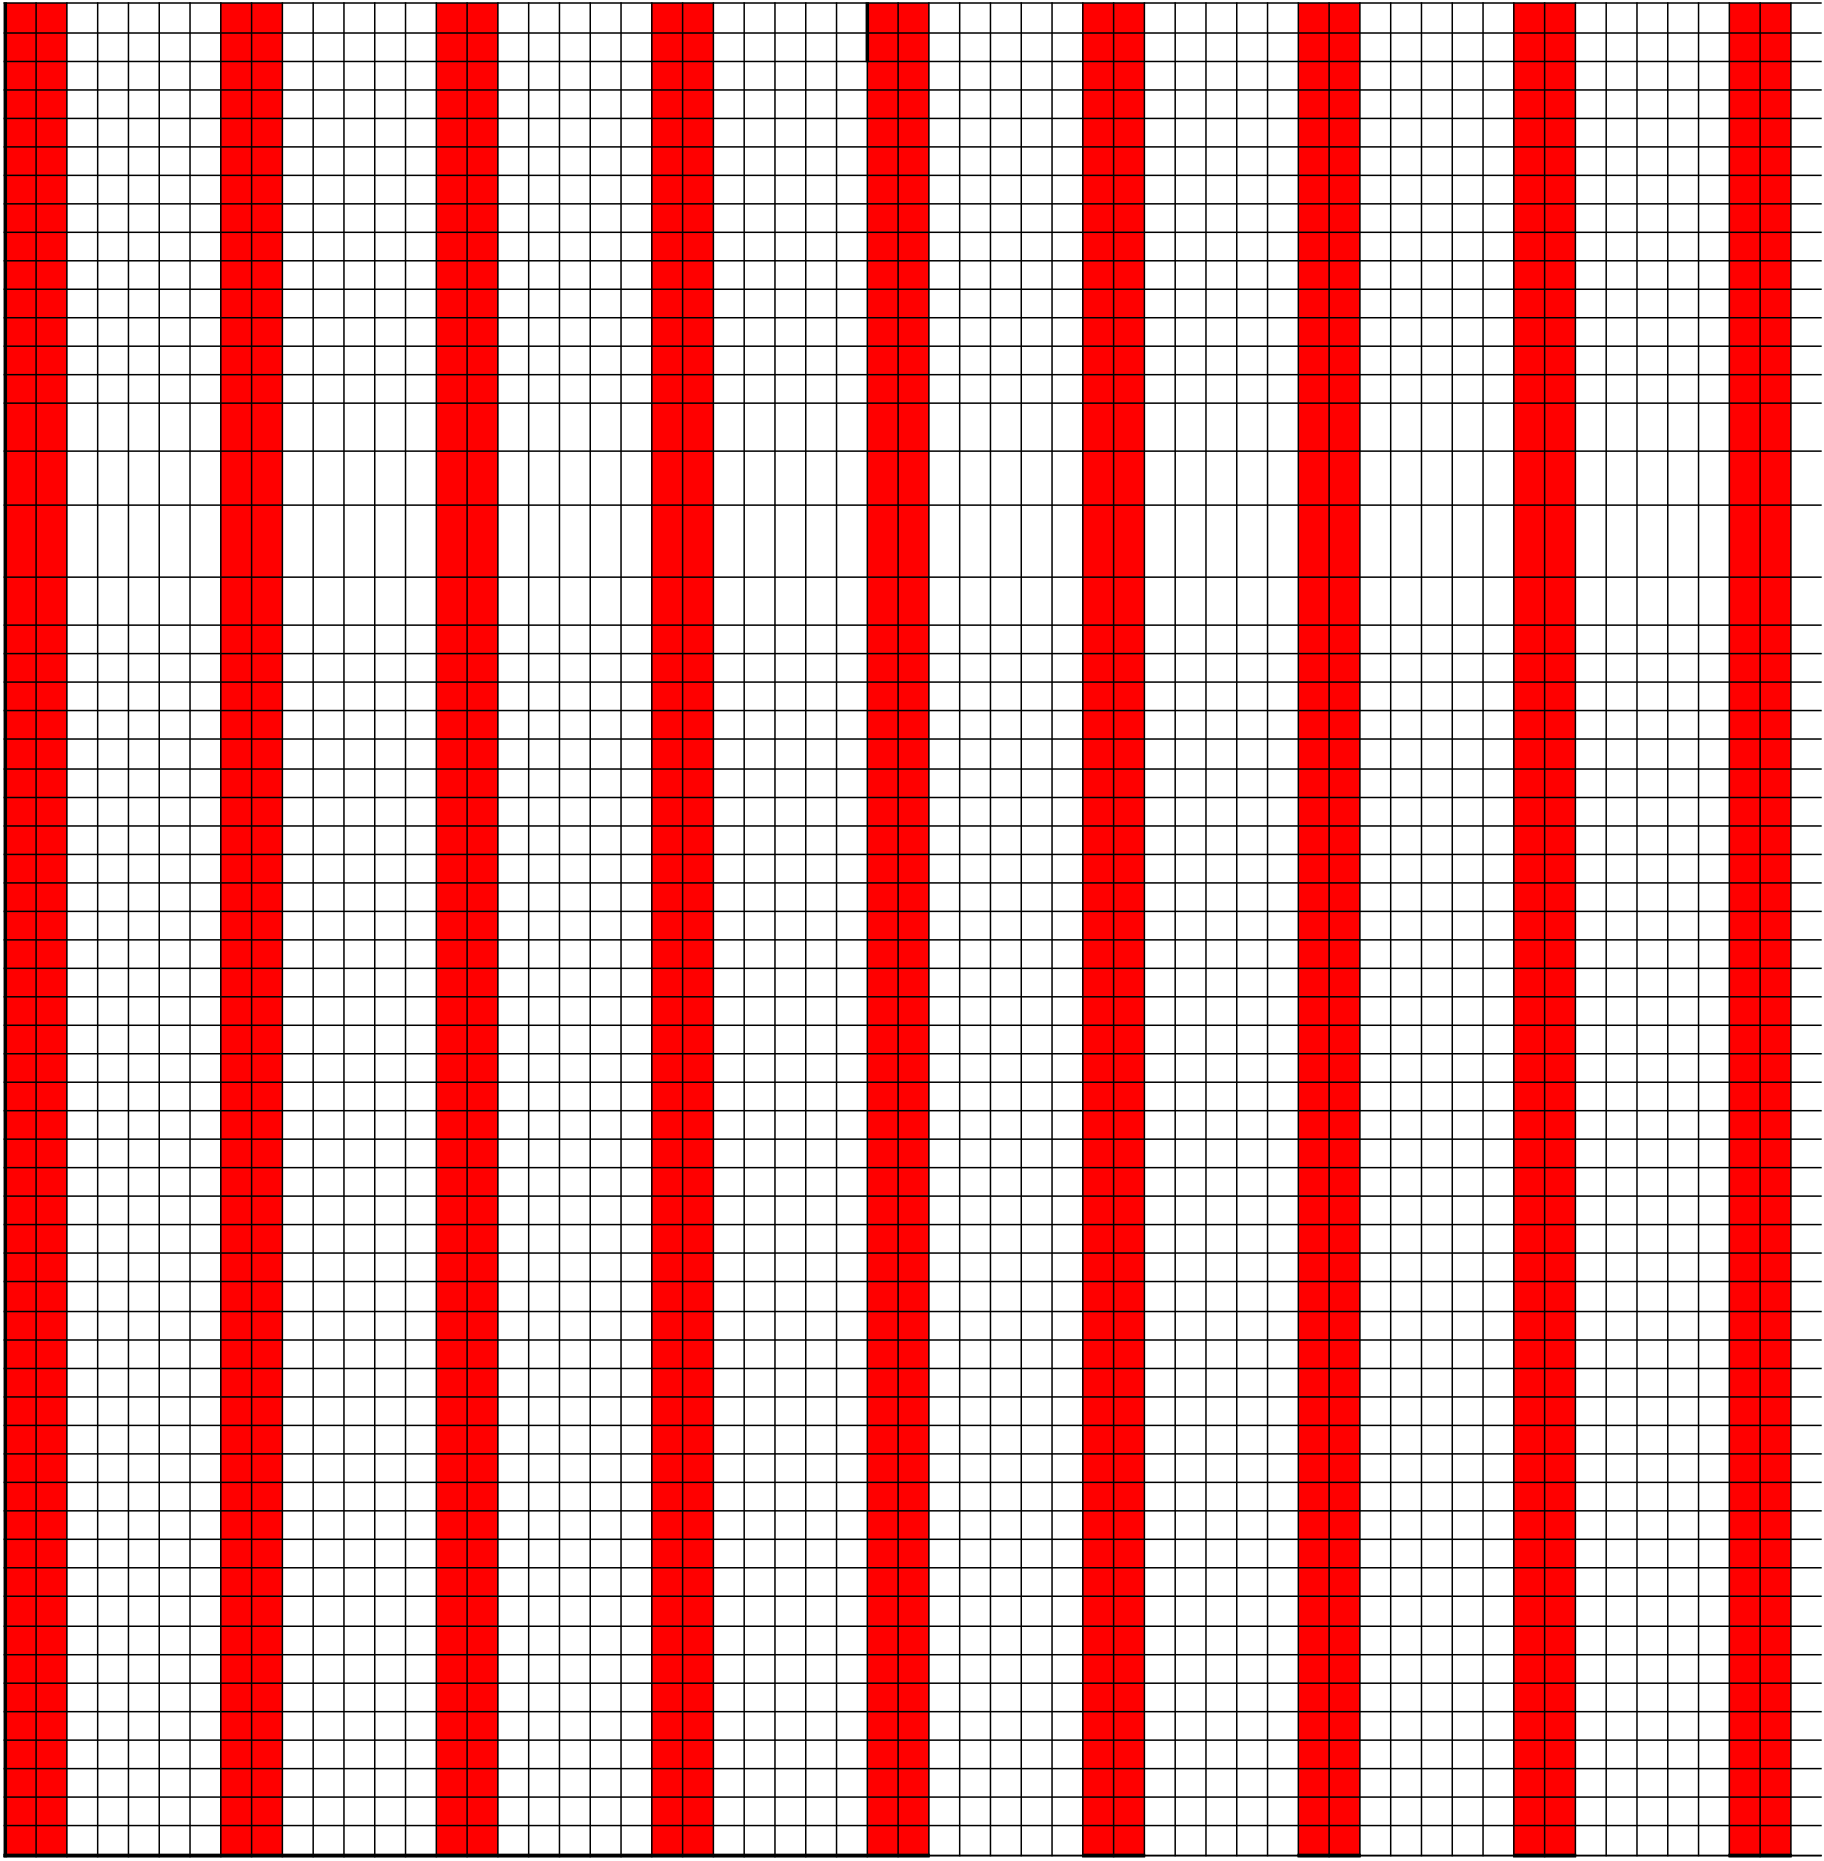



[illegible]

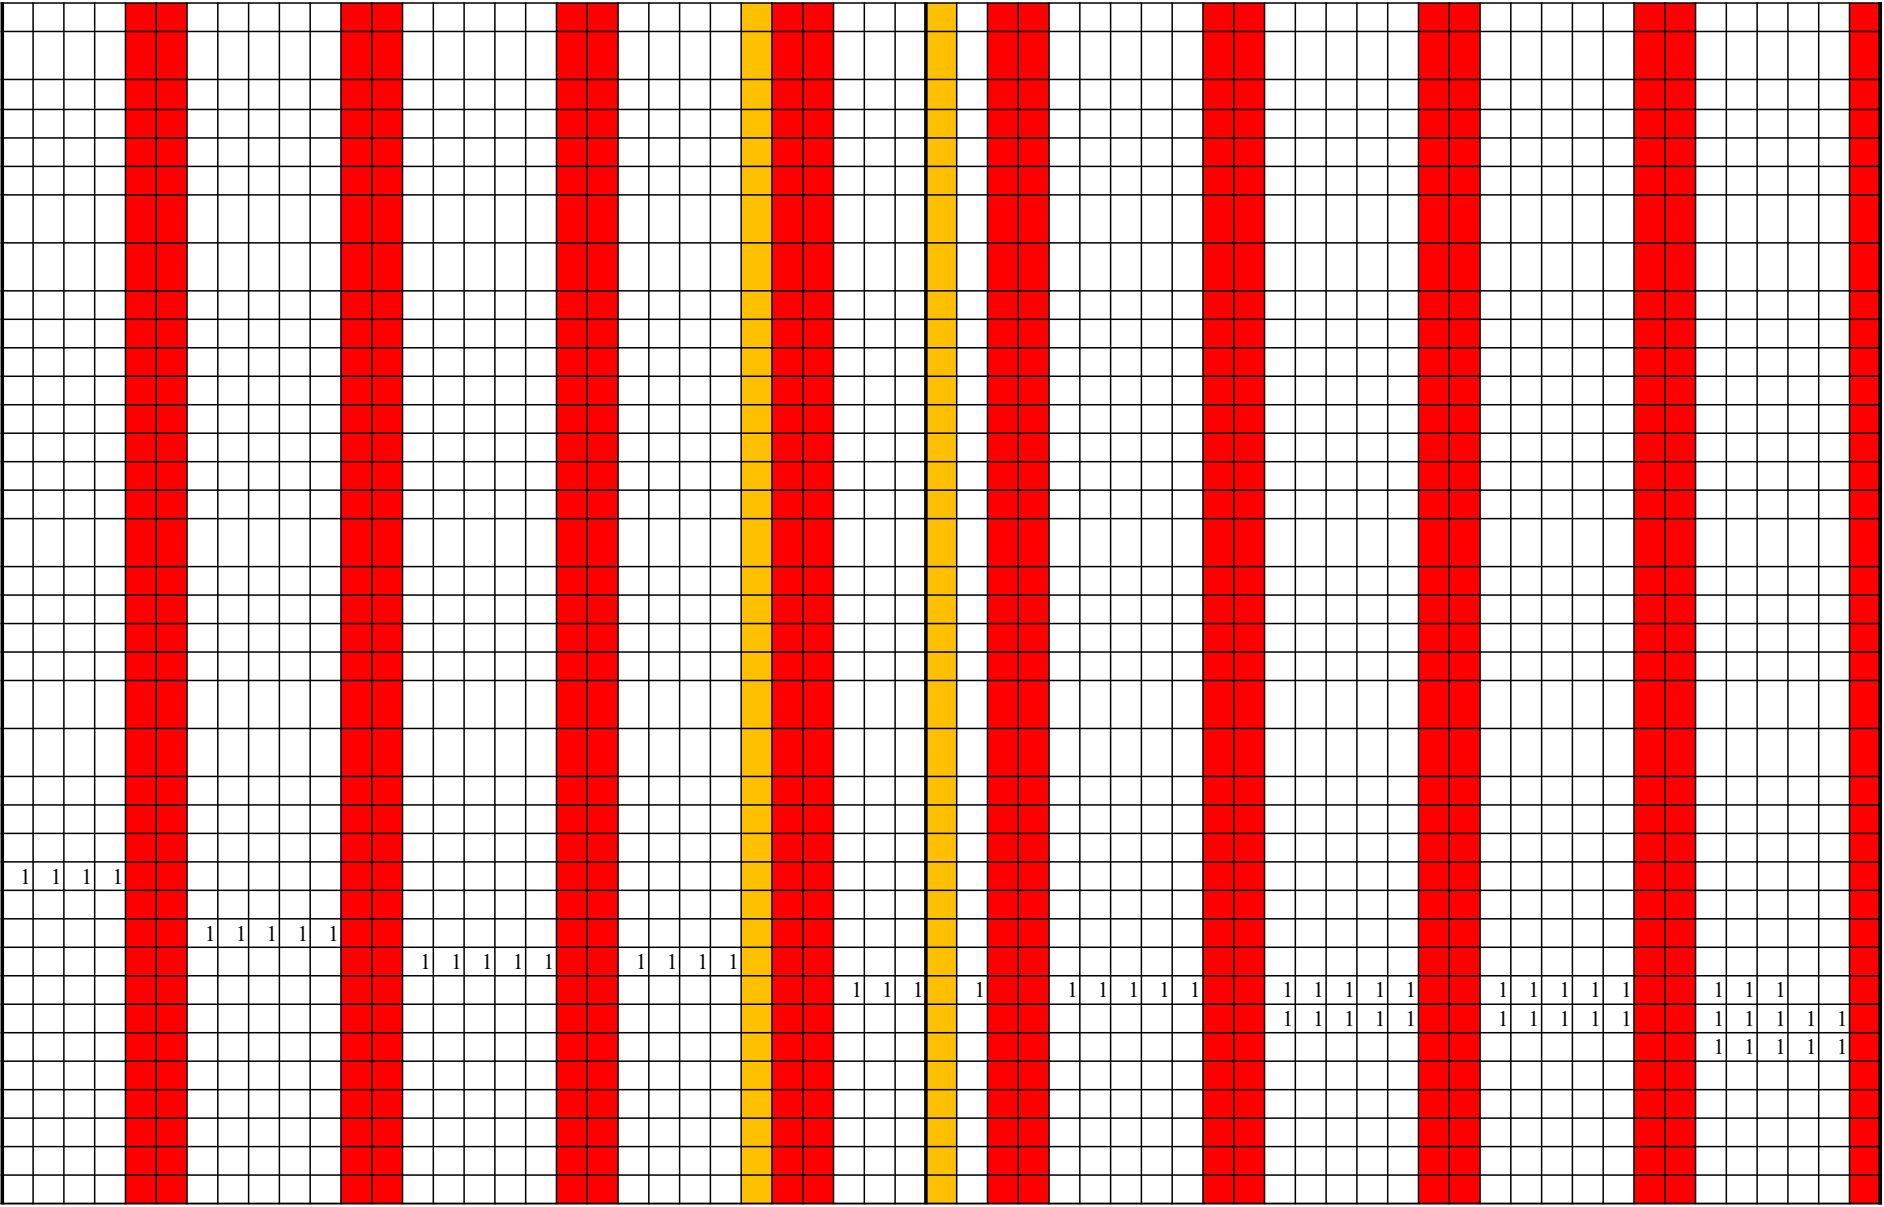

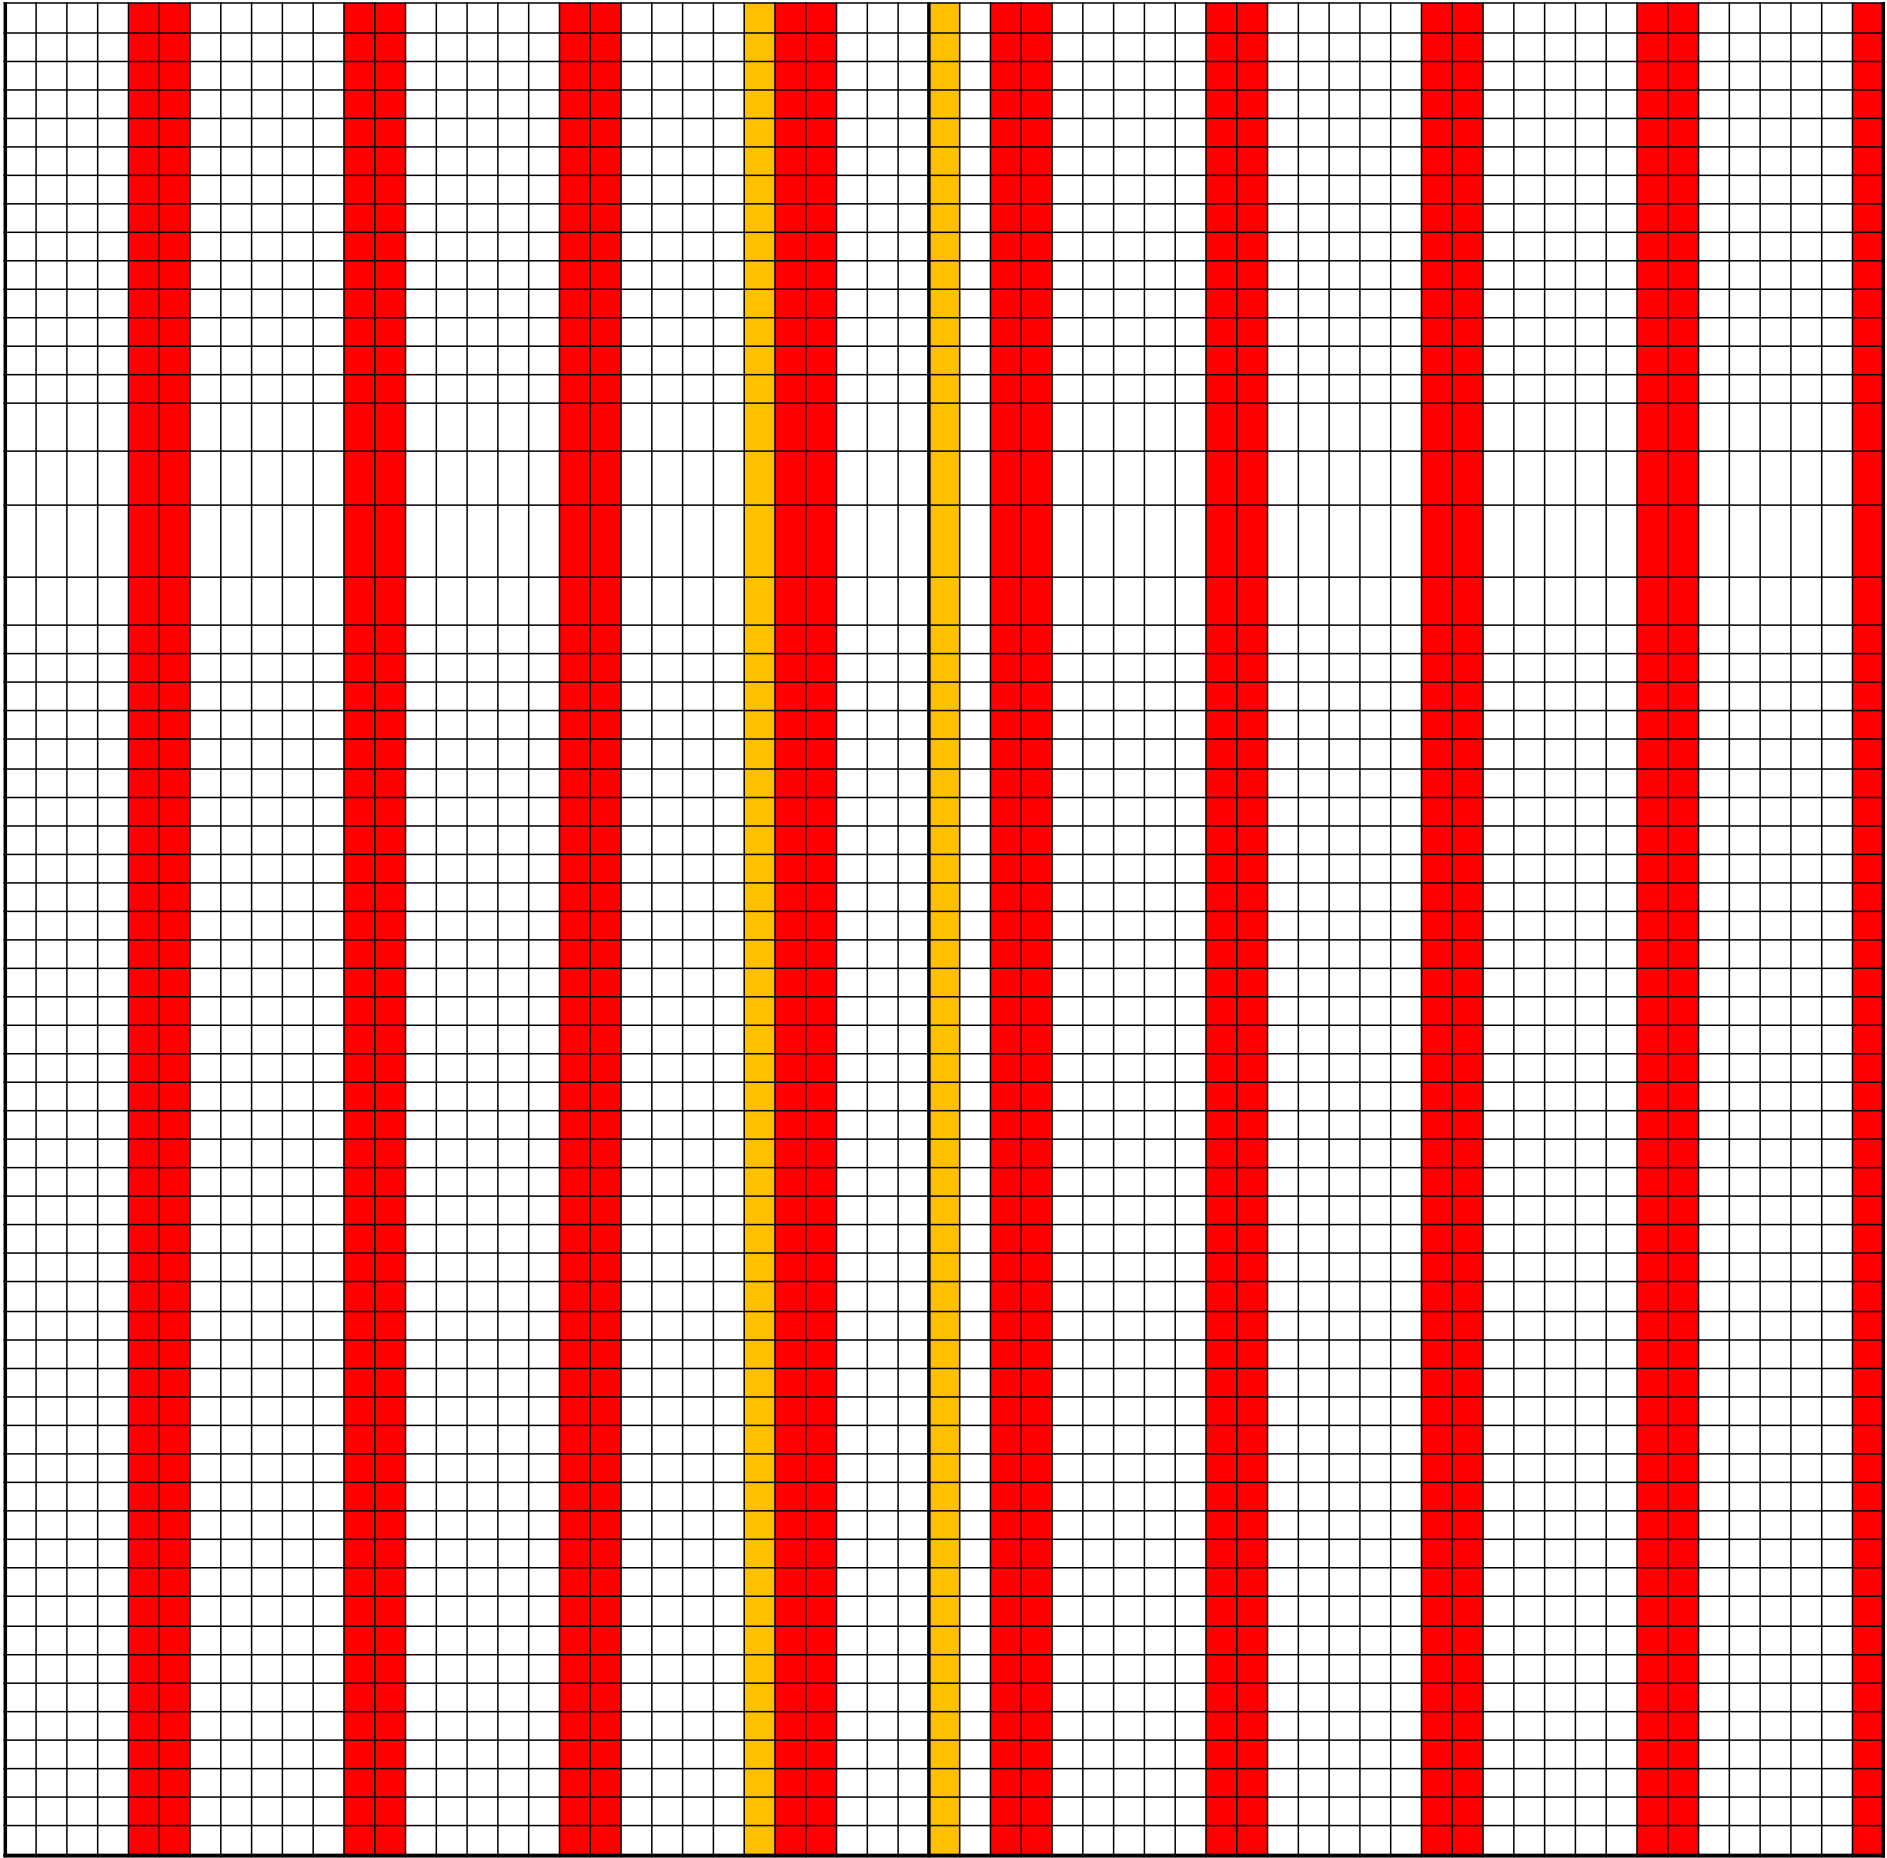

[illegible]

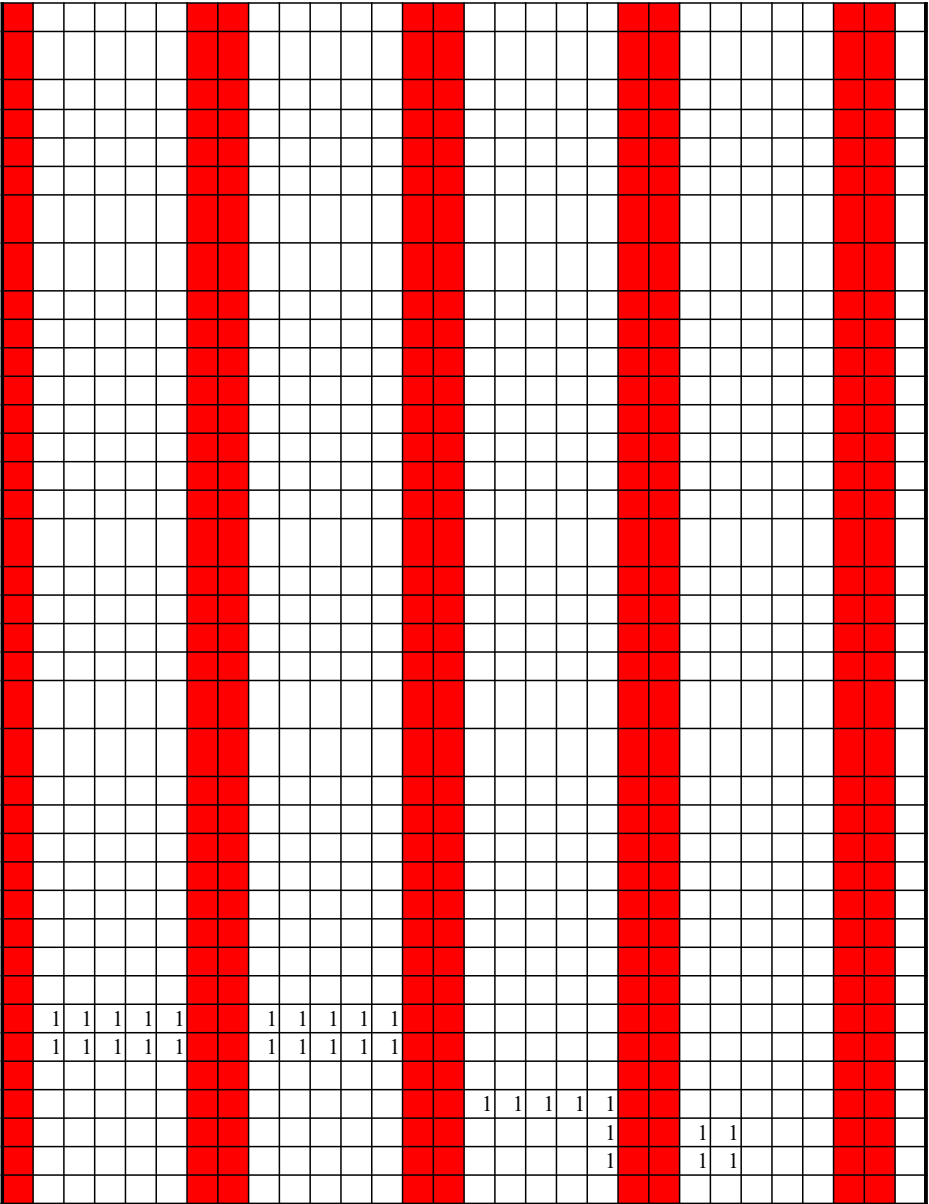



LAVORAZIONE	IMPORTO	DATA	Importo Prog
SICUREZZA	47.377,34	04/09/2023	47.377,34
Impianti di servizio del cantiere	3.500,00	04/09/2023	50.877,34
Allestimento del cantiere	5.500,00	07/09/2023	56.377,34
Murature	487.307,84	25/09/2024	543.685,18
Smontaggio di strutture in legno	60.000,00	30/10/2023	603.685,18
Posa in opera di strutture in legno	142.059,99	08/11/2023	745.745,17
Manti di copertura	94.000,00	11/12/2023	839.745,17
Opere di lattoneria	15.000,00	15/12/2023	854.745,17
Risanamenti da umidità	120.832,00	02/01/2024	975.577,17
Sistemi anticaduta	57.878,81	04/12/2023	1.033.455,98
Demolizioni	160.675,63	15/01/2024	1.194.131,61
Pareti divisorie, controsoffittature	7.263,40	02/04/2024	1.201.395,01
Serramenti	25.000,00	12/04/2024	1.226.395,01
Massetti e sottofondi	16.000,00	29/04/2024	1.242.395,01
Intonaci interni	197.756,99	03/06/2024	1.440.152,00
Pavimentazioni interne	150.619,64	22/07/2024	1.590.771,64
Rivestimenti interni	255.853,80	12/08/2024	1.846.625,44
Pitturazioni interne	60.998,47	19/08/2024	1.907.623,91
Assistenze murarie per impianti	7.000,00	02/09/2024	1.914.623,91
Impianti idrico-sanitario e del gas	91.375,87	03/09/2024	2.005.999,78
Impianti elettrici	210.514,72	28/10/2024	2.216.514,50
Impianti di condizionamento	170.922,21	02/01/2025	2.387.436,71
Impianti solari fotovoltaici	74.040,20	27/01/2025	2.461.476,91
Impianti antincendio	7.748,70	17/02/2025	2.469.225,61
Piantumazione e posa superfici verdi	61.782,36	25/03/2025	2.531.007,97
Pavimentazioni esterne	391.526,60	07/04/2025	2.922.534,57
Smobilizzo del cantiere	12.000,00	16/06/2025	2.934.534,57
Sicurezza Tronco A	362,34	02/10/2023	2.934.896,91
A_Demolizioni e rimozioni	60.000,00	02/10/2023	2.994.896,91
A_Sede stradale	35.150,40	19/10/2023	3.030.047,31
A_Opere d'arte	135.000,00	03/10/2023	3.165.047,31
A_Opere complementari	60.177,28	06/11/2023	3.225.224,59
Sicurezza Tronco B	2.885,98	20/11/2023	3.228.110,57
B_Demolizioni e rimozioni	61.738,00	20/11/2023	3.289.848,57
B_Opere complementari	837,36	20/11/2023	3.290.685,93
B_0+300_Demolizioni e rimozioni	6.587,65	21/11/2023	3.297.273,58
B_0+300_Sede stradale	27.000,00	01/12/2023	3.324.273,58
B_0+300_Opere complementari	27.046,36	27/12/2023	3.351.319,94
TRONCO B Prog 1+100	47.212,80	02/01/2024	3.398.532,74
B_1+100_Gabbionature	77.000,00	15/01/2024	3.475.532,74
B_1+100_Sede stradale	17.000,00	29/01/2024	3.492.532,74
B_1+100_Opere complementari	31.710,00	06/02/2024	3.524.242,74
B_1+300_Demolizioni e rimozioni	9.200,00	12/02/2024	3.533.442,74
B_1+300_Sede stradale	57.023,64	14/02/2024	3.590.466,38
B_1+300_Opere complementari	11.115,00	05/03/2024	3.601.581,38
